



เลขรับ	๓๕๓๐
วันที่	๒๓ ส.ค. ๕๕
เวลา	๑๖:๑๖

เลขรับ	๑๐๗/๓๗
วันที่	23 ส.ค. 2566
เวลา	๑๐:๓๖

เลขรับ	๓๒๐๘
วันที่	๒๑ ส.ค. ๕๖
เวลา	๑๕:๕๖

ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. (โทร.๕๕๕๖๖)
ที่ ๒๘ / ๖๖ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๖

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๖๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินกัน
ปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือมปีของ ทร. ณ สิ้นเดือน ก.ค.๖๖

เรียน ผบ.ทร.

๑. ตามที่ ผบ.ทร.ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ตามคำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ ๓๖๙/๒๕๖๕ ลง ๒๕ พ.ค.๖๕ โดยมี รอง ผบ.ทร. เป็นประธานฯ นั้น คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๖๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือมปีของ ทร. ณ สิ้นเดือน ก.ค.๖๖

๒. คณะกรรมการฯ ขอเรียนประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ทร. เป็นข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ของกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือน ก.ค.๖๖ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ทร. สรุปได้ดังนี้

๒.๑.๑ ปัจจุบัน ทร.ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณครบตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว จำนวน ๔๐,๐๖๖.๙๖ ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ จำนวน ๓๐,๓๗๗.๔๗ ล้านบาท รายจ่ายลงทุน จำนวน ๙,๔๘๙.๔๙ ล้านบาท

๒.๑.๒ ครม.รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๖๖ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาสในไตรมาสที่ ๔ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๓.๐๐ และเป้าหมายการใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒.๑.๓ ทร.มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๗,๐๕๐.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๑ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาส ๔ ร้อยละ ๒๕.๔๙ (๙๓.๐๐ - ๖๗.๕๑) และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๐,๑๑๗.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๗ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาส ๔ ร้อยละ ๒๔.๘๓ (๑๐๐.๐๐ - ๗๕.๑๗) รายละเอียดตามผนวก ก

๒.๑.๔ ผลการจัดลำดับของหน่วยใช้จ่ายใน กท. เป็นข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง จากระบบ New GFMS Thai แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ทร. โดยจำแนกผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

๒.๑.๔.๑ การใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๐,๑๑๗.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๗ เป็นลำดับที่ ๔ ของ กท. (ลำดับที่ ๑ สป.กท. ร้อยละ ๘๕.๐๔) ประกอบด้วย การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๒๔,๓๓๙.๒๒ ล้านบาท (จากจำนวน ๓๐,๐๗๗.๔๗ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๒ เป็นลำดับที่ ๒ ของ กท. (ลำดับที่ ๑ สป.กท. ร้อยละ ๙๐.๑๗) และการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕,๗๗๘.๓๙ ล้านบาท (จากจำนวน ๙,๔๘๙.๔๙ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๔ เป็นลำดับที่ ๕ ของ กท. (ลำดับที่ ๑ บก.ทท. ร้อยละ ๙๓.๗๙) รายละเอียดตามผนวก ๑ ของผนวก ก

๒.๑.๔.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๗,๐๕๐.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๑ เป็นลำดับที่ ๔ ของ กท. (ลำดับที่ ๑ สป.กท. ร้อยละ ๘๐.๙๑) โดยมีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๒๓,๙๑๖.๓๑ ล้านบาท...

กตป

๒๓,๙๑๖.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๒ เป็นลำดับที่ ๒ ของ กท. (ลำดับที่ ๑ สป.กท. ร้อยละ ๘๙.๕๙) และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓,๑๓๔.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๗ เป็นลำดับที่ ๕ (ลำดับที่ ๑ บก.ทท. ร้อยละ ๘๓.๘๘) **รายละเอียดตามอนุผนวก ๒ ของผนวก ก**

๒.๑.๔.๓ รายละเอียดการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙,๙๘๙.๔๙ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการผูกพันข้ามปีตามสัญญาหรือตาม ม.๔๑ จำนวน ๓,๐๒๗.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๑ รายจ่ายลงทุนที่ใช้งบประมาณปีเดียว จำนวน ๕,๕๘๔.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๐ และรายการผูกพันข้ามปี เริ่มใหม่ จำนวน ๑,๓๗๗.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๙ มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ **รายละเอียดตามอนุผนวก ๓ ของผนวก ก** และมีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนรายหน่วยงานที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐.๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป **รายละเอียดตามอนุผนวก ๔ ของผนวก ก** สรุปได้ดังนี้

๒.๑.๔.๓ (๑) รายการผูกพันข้ามปีตามสัญญาหรือตาม ม.๔๑ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๒๕๙.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๑ ประกอบด้วย การเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน ๑,๗๐๔.๒๑ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณ จำนวน ๕๕๔.๙๐ ล้านบาท

๒.๑.๔.๓ (๒) รายจ่ายลงทุนที่ใช้งบประมาณปีเดียว มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ จำนวน ๓,๔๙๐.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๕ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๔๐๘.๖๗ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณ จำนวน ๒,๐๘๒.๒๐ ล้านบาท

๒.๑.๔.๓ (๓) รายการผูกพันข้ามปีเริ่มใหม่ มีผลการใช้จ่าย งบประมาณ จำนวน ๒๘.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๑.๒๕ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณ จำนวน ๗.๑๕ ล้านบาท

๒.๒ ความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ สรุปได้ ดังนี้

๒.๒.๑ คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ครั้งที่ ๑๐/งป.๖๖ เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๖ โดย กบ.ทท.ได้รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ ทร.กำหนด (ทร.เห็นชอบ/อนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง ภายใน ๓๑ มี.ค.๖๖ และ ปล.กท./ผบ.ทสส.อนุมัติ ภายใน ๑๕ พ.ค.๖๖) พบว่ามีรายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินอนุมัติเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยถืองบประมาณที่ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๒๔ รายการ จากจำนวนทั้งหมด ๖๗ รายการ (๖๗ - ๔๓) ประกอบด้วย รายการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในอำนาจ ผบ.ทท. จำนวน ๑๕ รายการ และรายการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในอำนาจ ปล.กท./ผบ.ทสส. จำนวน ๙ รายการ **รายละเอียดตามผนวก ข** และในจำนวนนี้ มีรายการที่ยังไม่ประกาศเชิญชวน จำนวน ๕ รายการ คณะกรรมการฯ จึงได้สั่งการ ให้หน่วยต่าง ๆ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการให้ได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผูกพันงบประมาณให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้สามารถ ขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปีได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี ๖๖ ไว้เบิกเหลือในปี โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะติดตามและประสานการปฏิบัติกับกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ดังกล่าว พร้อมทั้ง ชี้แจงให้หน่วยต่าง ๆ ทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป **รายละเอียดตามบันทึก ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ที่ ๕๑/๖๖ ลง ๒๗ ก.ค.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)**

๒.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (กบ.ทท.) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๖ ประจำเดือน ก.ค.๖๖ **รายละเอียดตามบันทึกฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณฯ** ส่วนมาก ที่ กท ๐๕๐๖.๓/๘๖ ลง ๑๑ ส.ค.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) สรุปได้ดังนี้

๒.๒.๒.๑ รายการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินอนุมัติเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วย ถืองบประมาณ จำนวน ๖๗ รายการ วงเงินรวม ๔,๘๓๙.๙๘ ล้านบาท อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๔๗ รายการ...

๔๗ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔๓ รายการ คงเหลือรายการที่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๔ รายการ (๔๗ - ๔๓)

๒.๒.๒.๒ รายการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน ๑ ล้านบาท ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยถึงงบประมาณ จำนวน ๑๘๖ รายการ วงเงินรวม ๙๓๓.๔๖ ล้านบาท (จากเดิม ๑๘๘ รายการ วงเงินรวม ๙๓๐.๔๖ ล้านบาท ณ เดือน มิ.ย.๖๖) อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๑๘๕ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๘๔ รายการ

๒.๒.๒.๓ รายการจัดซื้อจัดจ้างรายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย (ทร.๑๒๐) ที่มีวงเงินเกิน ๑ ล้านบาท ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยถึงงบประมาณ จำนวน ๒๘๙ รายการ วงเงินรวม ๘๗๒.๙๑ ล้านบาท (จากเดิม ๒๙๑ รายการ วงเงินรวม ๘๘๗.๒๙ ล้านบาท ณ เดือน มิ.ย.๖๖) อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๒๘๙ รายการ (เพิ่มขึ้น) ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๘๘ รายการ

๒.๒.๓ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี ได้เชิญผู้แทนหน่วยที่มีรายการเงินกันงบประมาณปี ๖๕ ที่ได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณจนถึง ๓๐ ก.ย.๖๖ ตามหลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๖๕ ที่กระทรวงการคลัง (กค.) กำหนด มาชี้แจงข้อมูล รายการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอปัญหาข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไขปัญหา และแผนการดำเนินงาน รายละเอียดตามข่าวฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ (สปช.ทร.) ด่วน ที่ กตป.๑ ๒๓/๐๗/๖๖ มวว.๑๐๑๕๐๔ ก.ค.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) โดยพบว่ามีรายการที่มีความเสี่ยงที่งบประมาณจะพับไปเป็นวงเงินสูง จำนวน ๑๔ รายการ รวมเป็นเงิน ๒,๓๓๕.๗๐ ล้านบาท ปรับลดจากประมาณการเมื่อสิ้นเดือน มิ.ย.๖๖ (๒,๕๐๕.๖๗ ล้านบาท) เนื่องจากมีรายการที่ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตส่งออกยุทธโศปกรณ์ (Export License) เพิ่มเติม ทั้งนี้ รายการที่มีความเสี่ยงที่งบประมาณจะพับไป ยังคงมีสาเหตุหลักมาจากผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า มีปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องระหว่างการพิจารณาแก้ไขสัญญา งด/ลดค่าปรับ รายละเอียดตามผนวก ค ทั้งนี้ คณะทำงานได้กำชับให้หน่วยต่าง ๆ ประสานการปฏิบัติกับ กบ.ทร. สปช.ทร. และ สธน.ทร. เกี่ยวกับโครงการ/งาน ที่อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญา งด/ลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาตามสัญญา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และลดความเสี่ยงที่งบประมาณจะพับไป

๒.๒.๔ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (สปช.ทร.) ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี ที่ได้รับการอนุมัติการขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย ณ เม.ย.๖๖ รวมงบกลางและเบิกจ่ายแทนกัน จำนวน ๒๐๑ รายการ วงเงินรวม ๔,๒๒๗.๓๘ ล้านบาท ประกอบด้วย ประเภทเอกสาร PO จำนวน ๑๖๗ รายการ วงเงินรวม ๒,๕๙๗.๕๘ ล้านบาท ประเภทเอกสาร CX จำนวน ๓๒ รายการ วงเงินรวม ๒,๕๙๗.๕๘ ล้านบาท และประเภทเอกสาร PF จำนวน ๒ รายการ วงเงินรวม ๑.๔๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายปิดยอด ณ สิ้นเดือน ก.ค.๖๖ จำนวน ๙๘๓.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๖ คงเหลือ (รวมหมดความจำเป็น) จำนวน ๓,๒๔๓.๘๖ ล้านบาท รายละเอียดตามผนวก ง

๒.๒.๕ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (สปช.ทร.) ได้จัดทำรายงานผลการจัดสรรงบประมาณปี ๖๖ ชดเชย ให้กับหน่วยต่าง ๆ ที่จัดทำแผนความต้องการเงินพับปีงบประมาณ ๕๗ - ๖๔ จำนวน ๑,๒๔๒.๑๔ ล้านบาท โดยมีความต้องการใช้งบประมาณปี ๖๖ จำนวน ๔๕๔.๕๘ ล้านบาท และ สปช.ทร.ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยต่าง ๆ แล้ว จำนวน ๑๘๐.๑๗ ล้านบาท (เดิม ๑๔๒.๒๙) รายละเอียดตามผนวก จ

๒.๒.๖ สปช.ทร.แจ้งแนวทางการปฏิบัติด้านงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ ๖๖ โดยกำหนดให้หน่วยที่ได้รับงบประมาณปี ๖๖ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดการลงนามในสัญญาและผูกพันงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ให้ได้ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๖ กับพิจารณาส่งคืนงบประมาณ ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ หรืองานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือหมดความจำเป็นแล้ว หรือคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้ (หากดำเนินการต่อจะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือปีกรณีไม่มีหนี้) รายละเอียดตามข่าว สปช.ทร. ด่วน ที่ กงป. ๕๒/๐๗/๖๖ มวว. ๒๑๐๙๒๘ ก.ค.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ดังนี้

๓.๑ ทร.ได้รับงบประมาณปี ๖๖ จำนวน ๔๐,๐๖๖.๙๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายภาพรวม ๓๐,๑๑๗.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๗ เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือน มิ.ย.๖๖ ร้อยละ ๘.๐๗ (๗๕.๑๗ - ๖๗.๑๐) แต่ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาส ๔ ร้อยละ ๒๔.๘๓ มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม ๒๗,๐๕๐.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๑ เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือน มิ.ย.๖๖ ร้อยละ ๘.๑๗ (๖๗.๕๑ - ๕๙.๓๔) แต่ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๕.๔๙ โดยผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างและผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ใช้งบประมาณปีเดียว จำนวน ๕,๕๘๔.๕๐ ล้านบาท รายการผูกพันข้ามปีตามสัญญาหรือตาม ม.๔๑ จำนวน ๓,๐๒๗.๔๘ ล้านบาท และรายการผูกพันเริ่มใหม่ จำนวน ๑,๓๓๗.๕๑ ล้านบาท รวมวงเงิน ๙,๙๒๑.๙๙ ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๐ ของงบประมาณในภาพรวมของ ทร. ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นควรรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๖๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือปีของ ทร. ณ สิ้นเดือน ก.ค.๖๖ รายละเอียดตามผนวก ก - จ

๓.๒ สำหรับรายการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินอนุมัติเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยถืองบประมาณและยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๒๔ รายการ (๖๗ - ๙๓) รายละเอียดตามผนวก ข ซึ่งมีโอกาสจะไม่สามารถกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือปีและถูกพับไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือปี ซึ่งกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบในห้วงเดือน ก.ย.ของแต่ละปี นั้น อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณของ ทร. ในปีต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้หน่วยที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินอนุมัติเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยถืองบประมาณและยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๒๔ รายการดังกล่าว เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการให้ได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผูกพันงบประมาณในระบบ New GFMS Thai ให้ได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ในส่วนของรายการรายจ่ายลงทุน และรายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุงและผลิตเพื่อแจกจ่าย (ทร.๑๒๐) ที่มีวงเงินเกิน ๑ ล้านบาท และอยู่ในอำนาจอนุมัติของหัวหน้าหน่วยถืองบประมาณ ซึ่งมีจำนวนรายการและวงเงินงบประมาณลดลงจากเดือนที่ผ่านมา รายละเอียดตามข้อ ๒.๒.๒.๒ - ๒.๒.๒.๓ เนื่องจากหน่วยถืองบประมาณส่งคืนงบประมาณในรายการที่เหลือจ่ายหมดความจำเป็น หรือคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ ๖๖ โดย สปช.ทร.ได้รับคืนงบประมาณในส่วนนี้แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการด้านงบประมาณตามความเหมาะสม ในส่วนของรายการที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๒ รายการ คณะกรรมการฯ ได้เน้นย้ำหน่วยถืองบประมาณให้เร่งดำเนินการลงนามในสัญญาและผูกพันงบประมาณให้ได้โดยเร็ว

๔. เห็นควร

๔.๑ รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๖๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือปีของ ทร. ณ สิ้นเดือน ก.ค.๖๖ รายละเอียดตามผนวก ก - จ

๔.๒ ให้หน่วย...

๔.๒ ให้หน่วยที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินอนุมัติเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยถือ
งบประมาณและยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๒๔ รายการ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการให้ได้ตัวผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง และผูกพันงบประมาณให้ได้โดยเร็ว และดำเนินการตามข้อ ๓.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๔

พล.ร.อ.



รอง ผบ.ทร.

ประธานกรรมการเร่งรัดติดตาม

การเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือ

- อนุมัติ
พล.ร.อ. ๗๘๕
ผ.น.
๒๖ ธ.ค. ๕๕

สำเนาส่ง

สลก.ทร. (ผบ.ทร.) สลก.ทร. (บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน) (รอง ผบ.ทร. รอง เสธ.ทร. (สายงานส่งกำลังบำรุง))
นชต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. สปช.ทร.(ต้นเรื่อง)

๗๘๕
๒๓ ธ.ค. ๕๕

ผนวก ก

สถานการณ์การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณปี 66

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	การเงิน				การเบิกจ่าย								การใช้จ่าย			
	วงเงินงบประมาณ	คลังโอน	เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)	ผลต่างการเบิกจ่าย (สูง/ต่ำ)	เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละผลต่างของการเบิกจ่าย (สูง/ต่ำ)	คงเหลือ	เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาสที่ 4	ใช้จ่าย	ผลต่างการใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)	เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)	ร้อยละการใช้จ่าย	ร้อยละผลต่างของการใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)
รายการประจำ	30,077.47	29,475.93	23,916.31	23,916.31	98.00	(5,559.62)	79.52	(18.48)	6,161.17	30,077.47	24,339.22	(5,738.25)	100.00	80.92	(19.08)	5,738.25
รายจ่ายลงทุน	9,989.49	7,492.12	3,134.14	3,134.14	75.00	(4,357.98)	31.37	(43.63)	6,855.35	9,989.49	5,778.39	(4,211.10)	100.00	57.84	(42.16)	4,211.10
รวม	40,066.96	37,262.28	27,050.45	27,050.45	93.00	(10,211.83)	67.51	(25.49)	13,016.52	40,066.96	30,117.62	(9,949.35)	100	75.17	(24.83)	9,949.35

หมายเหตุ ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ปิดยอด ณ สิ้นเดือน ก.ค.66

ตรวจสอบถูกต้อง
 พล.ร.ต. *Hand items*
 (สมมาศ พลายแก้ว)
 ผอ.สงป.สช.พร.
๑๑๑ ส.ค.๖๖

อนุผนวก 1 ของผนวก ก

ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 66 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือน ก.ค.66

จำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม			
		วงเงิน งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	% ใช้จ่ายต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย การใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)	วงเงิน งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	% ใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย การใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)	วงเงิน งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	% ใช้จ่ายต่อ งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย การใช้จ่าย (สูง/ต่ำ)
1	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	7,097.60	6,399.97	90.17	(9.83)	2,132.69	1,449.78	67.98	(32.02)	9,230.29	7,849.75	85.04	(14.96)
2	กองบัญชาการกองทัพอากาศ	11,172.09	8,909.05	79.74	(20.26)	3,312.65	3,107.02	93.79	(6.21)	14,484.75	12,016.06	82.96	(17.04)
3	กองทัพอากาศ	23,656.70	19,035.99	80.47	(19.53)	12,057.09	7,952.16	65.95	(34.05)	35,713.79	26,988.15	75.57	(24.43)
4	กองทัพอากาศ	30,077.47	24,339.22	80.92	(19.08)	9,989.49	5,778.39	57.84	(42.16)	40,066.96	30,117.62	75.17	(24.83)
5	กองทัพบก	78,882.85	61,778.66	78.32	(21.68)	15,618.48	9,248.65	59.22	(40.78)	94,501.33	71,027.31	75.16	(24.84)

หมายเหตุ ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ปีโดยัด ณ สิ้นเดือน ก.ค.66

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต. *Siamkarn*

(สมมาศ พลายแก้ว)

ผอ.สจป.สปช.พร.

๑๐๐/ ส.ค.๖๖

อนุผนวก 2 ของผนวก ก

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 66 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือน ก.ค.66

จำแนกตามหน่วยงาน เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม				
		วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO	เบิกจ่าย	%เบิกจ่ายต่อวงงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO	เบิกจ่าย	%เบิกจ่ายต่อวงงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO	เบิกจ่าย	%เบิกจ่ายต่อวงงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย (สูง/ต่ำ)
1	สำนักงานเลขาธิการทรกกลาโหม	7,097.60	40.96	6,359.01	89.59	2,132.69	340.56	1,109.22	52.01	9,230.29	381.52	7,468.23	80.91	(12.09)
2	กองบัญชาการกองทัพอากาศ	11,172.09	383.92	8,525.13	76.31	3,312.65	328.40	2,778.62	83.88	14,484.75	712.32	11,303.75	78.04	(14.96)
3	กองทัพบก	78,882.85	2,646.03	59,132.63	74.96	15,618.48	3,553.81	5,694.84	36.46	94,501.33	6,199.84	64,827.47	68.60	(24.40)
4	กองทัพอากาศ	30,077.47	422.91	23,916.31	79.52	9,989.49	2,644.25	3,134.14	31.37	40,066.96	3,067.17	27,050.45	67.51	(25.49)
5	กองทัพอากาศ	23,656.70	1,905.35	17,130.64	72.41	12,057.09	1,949.37	6,002.79	49.79	35,713.79	3,854.72	23,133.43	64.77	(28.23)

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ปิดยอด ณ สิ้นเดือน ก.ค.66

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต. *Binna Tanee*


(สมมาศ พลายแก้ว)

ผอ.สจป.สข.พร.

๑๗ ส.ค.๖๖

อนุหมวด 3 ของผนวก ก


รายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 66 จำนวน 9,989.49 ล้านบาท

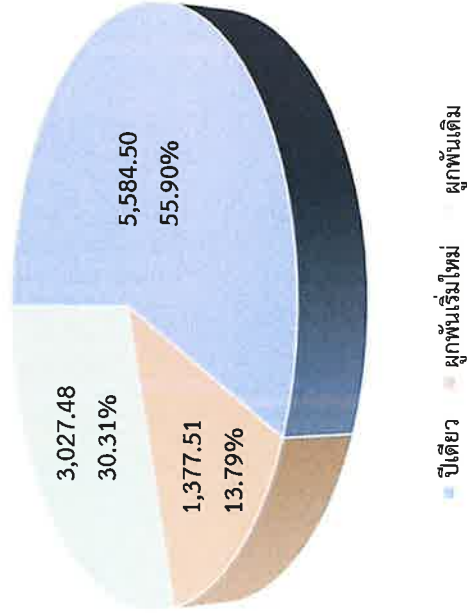


หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน				รวม		
	วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	% ใช้จ่าย ของรายจ่ายประจำ	ประเภท	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	ร้อยละใช้ จ่ายของ รายจ่าย ลงทุนทั้งหมด (*)	วงเงิน งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	ร้อยละใช้จ่ายต่อ งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง
ทร.	30,077.47	24,339.22	80.92	ปีเดียว	5,584.50	3,490.87	34.95	40,066.96	30,117.62	75.17
				ผู้กัพันเดิม	3,027.48	2,259.12	22.61			
				ผู้กัพันเริ่มใหม่	1,377.51	28.40	0.28			
	รวม (*)				9,989.49	5,778.39	57.84			

หน่วย : ล้านบาท

กราฟแสดงผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน ปีค.๖๖

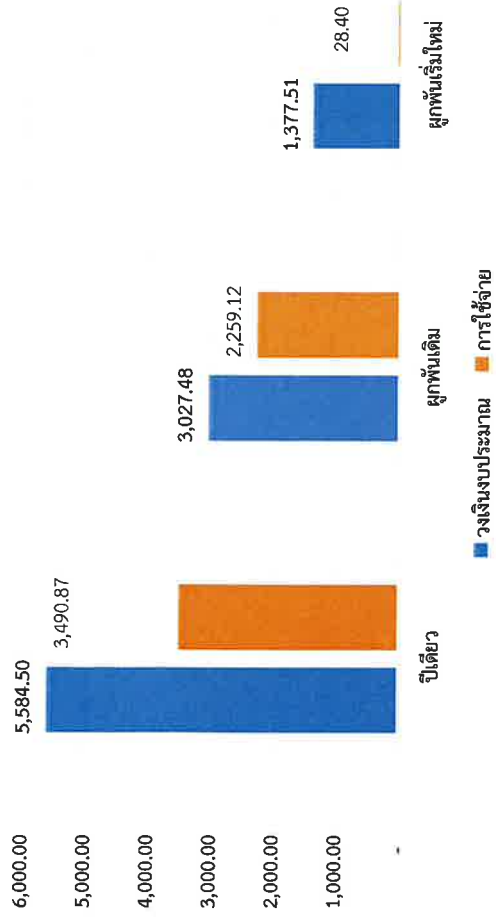

กราฟแสดงผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน (งานก่อสร้างและโครงการจัดหาทุติยภูมิ)
ปีค.๖๖ ณ สิ้นเดือน ก.ค.๖๖

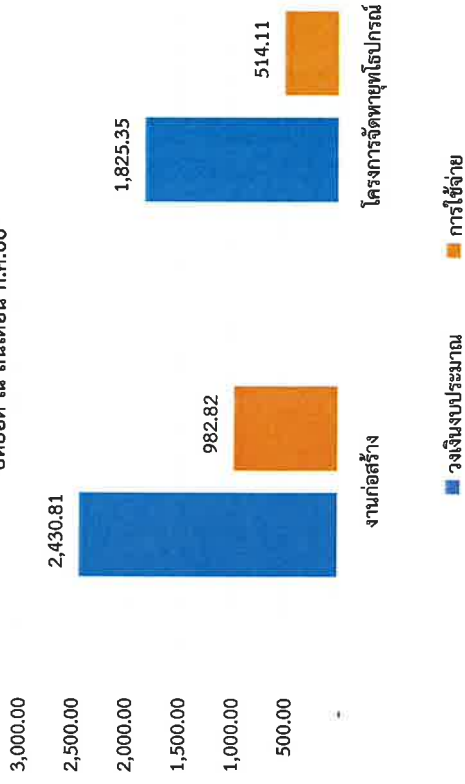

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต. *Dana Stone*


(สมมาศ พลายแก้ว)

ผอ.สงป.สพช.ทร.

๑๗ ส.ค.๖๖

อนุแผนว 4 ของแผนว ก

ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนหน่วยงาน ที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,000,000 บาทขึ้นไป ปิดยอด ณ สิ้นเดือน ก.ค.66

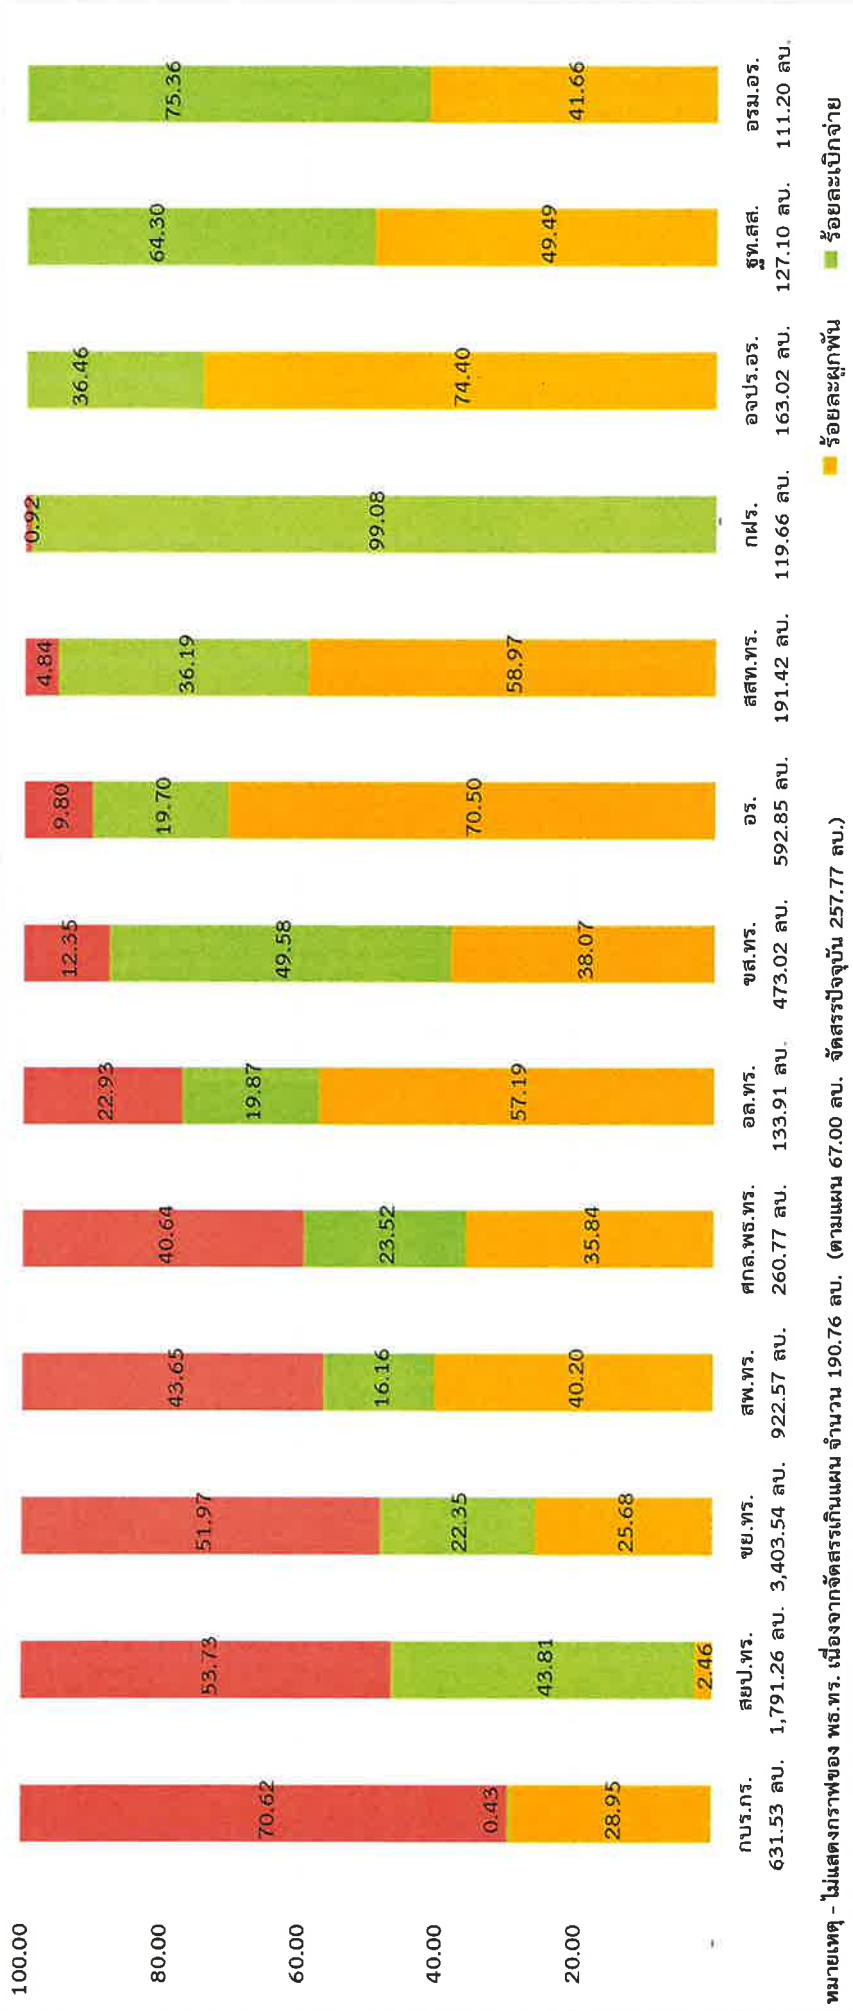

หมายเหตุ - ไม่แสดงกราฟของ พธ.ทร. เนื่องจากจัดสรรเงินแผน จำนวน 190.76 ลบ. (ตามแผน 67.00 ลบ. จัดสรรปัจจุบัน 257.77 ลบ.)

ตรวจถูกต้อง
 พล.ร.ต. *Diana Awan*
 (สมมาศ พลายแก้ว)
 ผอ.สยบ.สยช.ทร.
๑๐๐ ส.ค.๖๖

รายการจัดซื้อจัดจ้างเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยถึงงบประมาณ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน 24 รายการ

ลำดับ	หน่วย	โครงการ/งาน	วงเงิน	วงเงิน ปี 66	อำนาจอนุมัติ	สถานะการดำเนินการจัดจ้าง ณ ปัจจุบัน
1	ชล.พร.	จ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด 325 ครอบครัว พื้นที่ทั้งหมด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง	950,000,000.00	190,000,000.00	ปล.กท.	อยู่ระหว่างประกาศ/ออกหนังสือเชิญชวน
2	ชล.พร.	จ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ป.ด.นย. ตำบลลำทับก่อน อำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง จำนวน 1 งาน	1,815,000,000.00	363,000,000.00	ปล.กท.	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
3	ชล.พร.	โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทียบเรือ จ.ท.พ.ท.ภ.ก.3 ระยะที่ 1	736,500,000.00	147,300,000.00	ปล.กท.	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
4	สย.พร.	จัดหารื้อปฏิบัติการอุตสาหกรรม	997,000,000.00	199,400,000.00	ปล.กท.	อยู่ระหว่าง ปล.กท.อนุมัติ
5	สย.พร.	โครงการจัดการหมูมารุสของ (88) ชนิดค้ำเลี้ยงลด จำนวน 7 คัน	448,000,000.00	448,000,000.00	ปล.กท.	รอลงนามในสัญญา
6	ชล.พร.	จ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ พร้อมอาคารบริวาร สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่สี่ตึก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	208,019,480.00	41,603,900.00	สย.พสส.	อยู่ระหว่าง สย.พร.เห็นชอบ
7	ชล.พร.	จ้างก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องปั้นดินเผา 203 กองงานไฟฟ้าและกองงานเครื่องกล ชย.พร.	150,000,000.00	30,000,000.00	สย.พสส.	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
8	ชล.พร.	จ้างก่อสร้างโรงปรับปรุงสภาพ (RECOVERY) อ.ลล.4 (S-76B) หมายเลข 2308	125,000,000.00	25,000,000.00	สย.พสส.	อยู่ระหว่าง สย.พร.เห็นชอบ
9	กบ.กร.	จ้างซ่อมปรับปรุงสภาพ (RECOVERY) อ.ลล.4 (S-76B) หมายเลข 2308	204,000,000.00	204,000,000.00	สย.พสส.	อยู่ระหว่าง สย.พสส.อนุมัติ
10	ชล.พร.	จ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด 79 ครอบครัว พื้นที่ทั้งหมด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง	162,000,000.00	32,400,000.00	สย.พร.	อยู่ระหว่างประกาศ/ออกหนังสือเชิญชวน
11	ชล.พร.	โครงการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและแท่นยิงตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำสำหรับเรือ คว. ชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน 1 ระบบ	95,000,000.00	19,000,000.00	สย.พร.	อยู่ระหว่าง สย.พร.อนุมัติ
12	สท.พร.	โครงการซ่อมปรับปรุงกะเจมไฟฟ้าทะเลจีน จว.ปัตตานี พร้อมติดตั้งระบบเฝ้าตรวจ และรายงานแจ้งเตือนเตือนภัยทางทะเล	287,267,000.00	114,906,800.00	สย.พร.	ทรงงม.เสนอ LOA ให้ ทร. พท.พร. เสนอหน่วยพิจารณา
13	ชล.พร.	โครงการซ่อมปรับปรุงกะเจมไฟฟ้าทะเลจีน จว.ปัตตานี พร้อมติดตั้งระบบเฝ้าตรวจ และรายงานแจ้งเตือนเตือนภัยทางทะเล	27,900,000.00	27,900,000.00	สย.พร.	อยู่ระหว่างยื่นขอเสนอราคา
14	ชล.พร.	งานก่อสร้างที่จอดเรือ กลน.กร.	68,000,000.00	68,000,000.00	สย.พร.	รอลงนามในสัญญา
15	ชล.พร.	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.ผ.ร. และระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ	65,000,000.00	65,000,000.00	สย.พร.	อยู่ระหว่างยื่นขอเสนอราคา
16	ชล.พร.	โครงการก่อสร้างกองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พื้นที่สี่ตึก (ต่อเนื่อง)	26,000,000.00	26,000,000.00	สย.พร.	อยู่ระหว่าง สย.พร.อนุมัติ
17	ชล.พร.	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเบีและอาคารโรงจอดรถ พัน.ป.ก.ด.กรม.ป.พล.นย. (ATMG) จำนวน 2 หลัง	32,000,000.00	32,000,000.00	สย.พร.	รอลงนามในสัญญา
18	ชล.พร.	โครงการก่อสร้างกองบัญชาการ กองเรือบรรรทุกเรือติดอู่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก	65,000,000.00	65,000,000.00	สย.พร.	รอลงนามในสัญญา
19	ชล.พร.	งานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางเรือทะเล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค บริเวณท่าเรือแหลมเทียน จำนวน 1 หลัง	50,000,000.00	50,000,000.00	สย.พร.	อยู่ระหว่าง พน.ท.พร.เห็นชอบ
20	กบ.กร.	จ้างปรับปรุง NAVIGATION COCKPIT สำหรับ ส.ป.ด.1 (S-70B)	115,700,000.00	115,700,000.00	สย.พร.	อยู่ระหว่าง สย.พร.อนุมัติ
21	กบ.กร.	จ้างซ่อมคืนสภาพ (REFURBISH) บ.ตช.1 หมายเลข 1311	58,850,000.00	58,850,000.00	สย.พร.	อยู่ระหว่าง สย.พร.อนุมัติ
22	ชล.พร.	จัดซื้อรถดับเพลิงไฟฟ้าและเคมีขนาดใหญ๋ จำนวน 1 คัน	45,000,000.00	45,000,000.00	สย.พร.	อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกรวจินิจฉัยพิจารณา
23	สย.พร.	จัดสร้างเครื่องปั้นทะเล (MAX-4)	12,000,000.00	12,000,000.00	สย.พร.	อยู่ระหว่าง สย.พร.อนุมัติ
24	สย.พร.	จัดสร้างเครื่องปั้นทะเล (MAX-5)	12,000,000.00	12,000,000.00	สย.พร.	อยู่ระหว่าง สย.พร.อนุมัติ
			6,755,236,480.00	2,392,060,700.00		

รวม

กำหนดผลงานในสัญญารายการจัดซื้อจ้างประมาณ 66 (เกินอำนาจอนุมัติ หน.หน่วย) วงเงิน 4,345,001,380 บาท

1,200,000,000.00


1,000,000,000.00

800,000,000.00

600,000,000.00

400,000,000.00

200,000,000.00

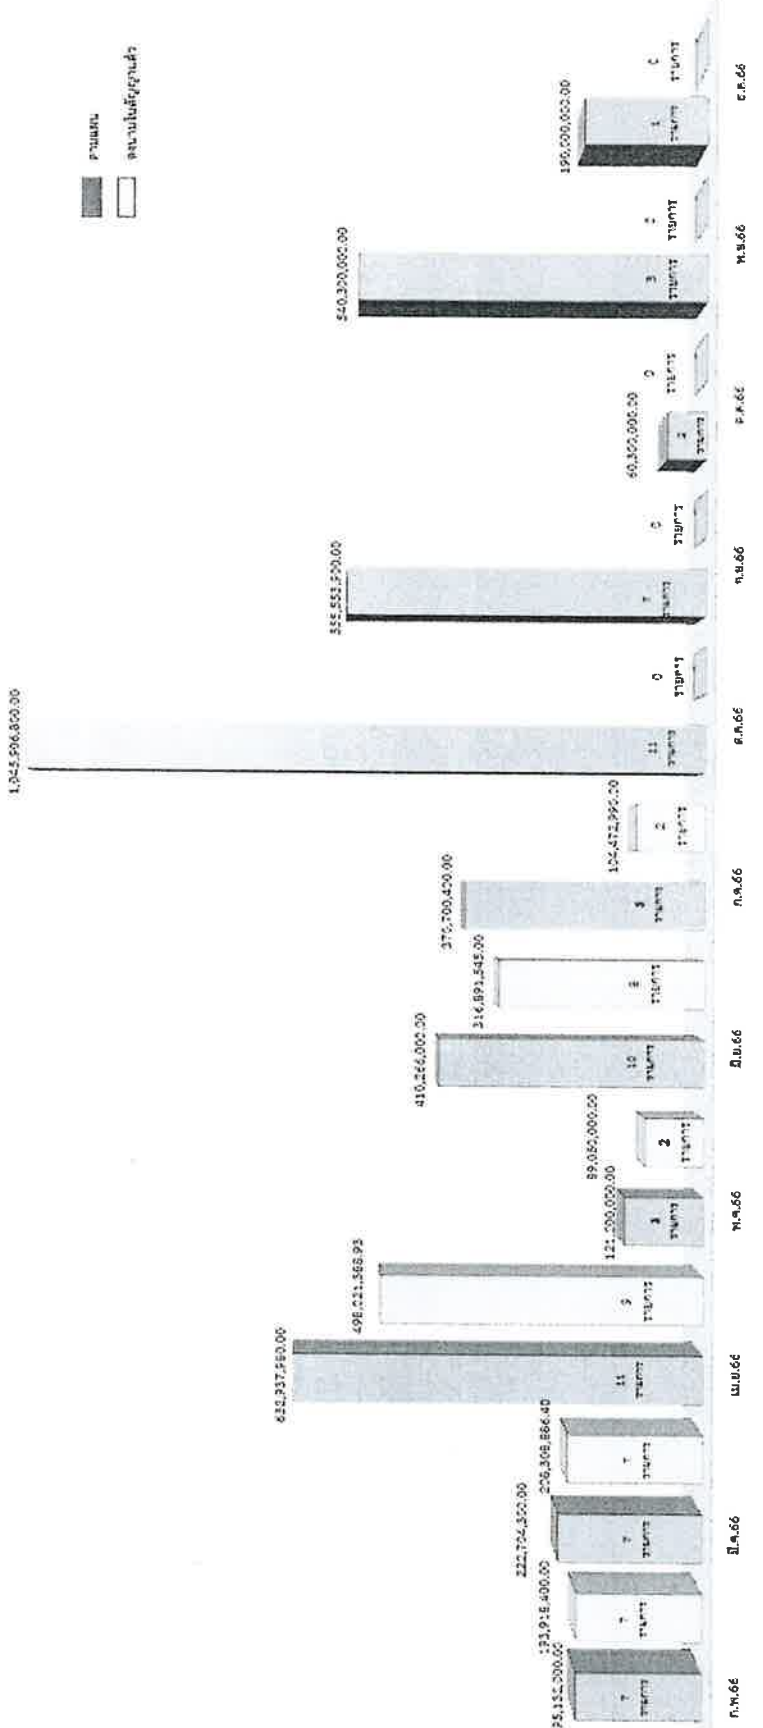

ตรวจโดย
พล.ต. Daniel Aleva
 (สมชาติ พลอยแก้ว)
 ผอ.สบ.สพ.ท.
 ๑๐๒/ส.ค.๖๖

รายการเงินกันปึงประมาณ 65 ไร่เบิกเหลือในปี ที่คาดว่าจะมีเงินพิชิตก/พิชิตกบางส่วน
เนื่องจากดำเนินการล่าช้า/มีแผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	หน่วย	รายการ	กค.อนุมัติ ต.ค.65	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ประมาณการเงินพิชิต (มิ.ย.66)	ประมาณการเงินพิชิต (ก.ค.66)	การเปลี่ยนแปลง
1	สย.พร.	โครงการจัดหาเรือดำน้ำ ระยะที่ 1	1,567.80	-	1,567.80	1,567.80	1,567.80	คงที่
2	ขย.พร.	จ้างก่อสร้างทางลาดเรือดำน้ำ ระยะที่ 1	455.17	123.93	331.24	311.11	265.64	ลดลง
3	ขย.พร.	การก่อสร้างอาคาร บก.สรชล. ระยะที่ 1	434.54	20.01	414.53	400.87	335.52	ลดลง
4	ขย.พร.	ค่าก่อสร้างอาคาร บก.สรชล.ภาค 2	50.67	-	50.67	50.67	50.67	คงที่
5	ขย.พร.	โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ	102.90	30.72	72.18	28.70	25.55	ลดลง
6	ขย.พร.	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.พร.	76.55	36.63	39.92	7.14	14.65	เพิ่มขึ้น
7	สสท.พร.	ซื้อวิทยุพร้อมสายอากาศรองรับการติดต่อสื่อสารเรือดำน้ำ	60.00	-	60.00	49.50	39.00	ลดลง
8	กบ.ร.กร.	จ้างซ่อมปรับปรุง ฮ.ปด. (S-70B) ระยะที่ 3 No.3201	51.40	27.35	24.05	28.90	24.05	ลดลง
9	สพ.พร.	จัดซื้อ Celt HR Laser Range Finder	6.31	-	6.31	6.31	6.31	คงที่
10	ขย.พร.	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 32 ครอบครัวฯ ของ นย.	34.80	31.94	2.87	0.00	2.87	รายการใหม่
11	อด.พร.	จัดซื้อ ANALOG INTERFACE ของระบบสื่อสารแบบรวมการฯ ร.ล.จักรีนฤเบศร	1.71	-	1.71	1.71	1.71	คงที่
12	สสท.พร.	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับวิทยุ VLF/HF สมับศูนย์ศูนย์สื่อสารกลาง ทร.	1.20	-	1.20	0.00	1.20	รายการใหม่
13	ขย.พร	จ้างที่ปรึกษาจัดทำ EIA งานโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ	3.60	0.54	1.65	0.54	0.54	คงที่
14	ขย.พร	จ้างที่ปรึกษาจัดทำ EIA งานโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ของ นย. และ ศกส.พร.ทร.	1.00	0.20	0.80	0.20	0.20	คงที่
รวม			2,847.64	272.71	2,574.93	2,453.45	2,335.71	

หน่วยล้านบาท

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต. *Diana Amano*

(สมมาศ พลายแก้ว)

ผอ.สง.ป.สยช.ทร.

๑๐๐ ส.ค.๖๖

ผนวก ง

สรุป แผนการเบิกจ่ายเงินขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 65 (ปีထုတ် ၈ 31 ဂ.က.၆၆)

ลำดับ	หน่วย	จำนวนรายการ	งบกลางปี 66	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินที่ค้างชำระ	แผนการเบิกจ่าย										รวม	จำนวน						
							พ.ค.65	พ.ค.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66			ก.ค.66	ก.ค.66	ก.ค.66			
1	ศูนย์	2	1,802,024,326.23	211,415,096.42	1,590,609,229.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ศูนย์	30	1,332,672,301.96	303,573,670.30	1,029,100,631.66	286,182.12	49,201,694.25	28,839,275.00	74,428,611.60	95,687,034.40	137,232,563.20	139,024,112.40	57,203,000.00	206,639,894.90	113,408,231.40	35,541,891.20	14,171,366.85	129,532,732.16	1,567,604,661.46	1,590,609,229.81	1,029,100,631.66	1,029,100,631.66	1,029,100,631.66	
3	ศูนย์	31	219,950,991.13	72,573,832.55	147,377,158.58	321,687.48	3,999,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,739,768.28	147,377,158.58	147,377,158.58	147,377,158.58	147,377,158.58	
4	ศูนย์	15	140,739,768.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,739,768.28	140,739,768.28	140,739,768.28	140,739,768.28	140,739,768.28	
5	ศูนย์	7	236,409,876.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,938,696.30	87,938,696.30	87,938,696.30	87,938,696.30	87,938,696.30	
6	ศูนย์	36	125,272,326.72	45,730,267.80	79,542,078.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,886,008.00	50,886,008.00	50,886,008.00	50,886,008.00	50,886,008.00	
7	ศูนย์	6	93,017,493.15	34,836,869.70	58,180,623.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,505.30	239,505.30	239,505.30	239,505.30	239,505.30	
8	ศูนย์	29	68,175,622.32	31,979,223.60	36,196,398.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,458,148.30	34,458,148.30	34,458,148.30	34,458,148.30	34,458,148.30	
9	ศูนย์	15	64,506,661.01	33,275,522.95	31,231,138.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,569,000.00	2,569,000.00	2,569,000.00	2,569,000.00	2,569,000.00	
10	ศูนย์	11	117,141,610.09	109,232,990.04	7,908,620.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,888,620.05	7,888,620.05	7,888,620.05	7,888,620.05	7,888,620.05	
11	ศูนย์	5	1,736,700.00	1,250,000.00	486,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506,700.00	506,700.00	506,700.00	506,700.00	506,700.00	
12	ศูนย์	6	6,138,924.91	6,138,924.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ศูนย์	2	12,260,700.00	12,260,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ศูนย์	1	1,596,000.00	1,596,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ศูนย์	3	4,549,400.00	4,549,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ศูนย์	1	834,600.00	834,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ศูนย์	1	329,002.40	329,002.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		201	4,227,375,206.81	995,525,142.37	3,239,941,098.29	3,214,964.73	52,701,194.25	34,417,262.20	79,470,701.60	98,059,290.08	139,023,101.20	159,348,530.99	207,289,652.30	200,783,841.95	249,052,769.25	37,845,667.97	1,979,977,566.50	3,239,941,098.29	3,239,941,098.29	3,239,941,098.29	3,239,941,098.29	3,239,941,098.29	3,239,941,098.29	

ตรวจถูกต้อง
 พล.ร.ต. *Thana Htun*
 (สมภาค พลายนแก้ว)
 ผอ.สจป.สบข.พร.
 ๑๗/ ส.ค.๖๖

ลำดับ	หมวด	ประเภท	รายการ	ประเภท รายการ	มูลค่าเทียบกับ รายการข้างต้น	งบประมาณ ที่ไป/รายการ งบประมาณเหลือ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณเดือน			การชดเชยงบประมาณ (ค.บ.บ. ค.บ.บ.ก.)	แหล่งงบประมาณ ของเงินกู้ (ค.บ.บ. ค.บ.บ.ก.)	หมายเหตุ
							ความต้องการ งบประมาณที่ 66	ความต้องการ งบประมาณที่ 67	รวมปี ณ.66/67			
47	สหพร.	ผูกพันข้ามปี	จัดซื้ออุปกรณ์ ขนาด 30 มม (โครงการจัดหาเรือ คผ.ช. 580 x 997 - 998) (ปี.ง.62)	CX	14,105,000.00	6,500.00	-	6,500.00	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ (งบรายการใหม่และ สท.พร.)
48	ข.พร.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น ๒ ชั้น ๓ ชั้น. จำนวน 1 หลัง	PO	12,374,299.96	12,374,299.96	-	12,374,299.96	-	-	-	-
49	ข.พร.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น ๒ ชั้น ๓ ชั้น. จำนวน 1 หลัง	PO	411,780.00	411,780.00	-	411,780.00	-	-	-	-
50	ข.พร.	ปีเดียว	ก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น ๒ ชั้น ๓ ชั้น. จำนวน ๑ หลัง	PO	40,637,626.15	40,637,626.15	-	40,637,626.15	-	-	2,159,000.00	พ.ท. 170 (3)
51	ข.พร.	ผูกพันข้ามปี	ก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น ๒ ชั้น ๓ ชั้น. จำนวน 1 หลัง	PO	2,974,990.33	2,974,990.33	-	2,974,990.33	-	-	-	-
52	สหพร.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ๓๐๐ มม. จำนวน 2 หน่วย (ปี.ง.62)	CX	27,841,750.00	27,841,750.00	-	27,841,750.00	-	-	-	-
53	สหพร.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ๓๐๐ มม. จำนวน 2 หน่วย (ปี.ง.62)	CX	854,690.45	854,690.45	-	854,690.45	-	-	-	-
54	สหพร.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ๓๐๐ มม. จำนวน 2 หน่วย (ปี.ง.62)	CX	2,902,866.68	2,902,866.68	-	2,902,866.68	-	-	-	-
55	สหพร.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ๓๐๐ มม. จำนวน 2 หน่วย (ปี.ง.62)	CX	6,021,899.94	6,021,899.94	-	6,021,899.94	-	-	-	-
56	สหพร.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ๓๐๐ มม. จำนวน 2 หน่วย (ปี.ง.62)	CX	9,113,371.00	9,113,371.00	-	9,113,371.00	-	-	6,021,899.94	-
57	สหพร.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ๓๐๐ มม. จำนวน 2 หน่วย (ปี.ง.62)	CX	8,039,199.75	8,039,199.75	-	8,039,199.75	-	-	9,113,371.00	-
58	สหพร.	ปีเดียว	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ๓๐๐ มม. จำนวน 2 หน่วย (ปี.ง.62)	CX	32,805,474.19	32,805,474.19	-	32,805,474.19	-	-	126,051.59	-
59	สหพร.	ปีเดียว	จัดซื้อ HDLC/COURSE BUS SWITCH BOX 155 MM (2.466 EA) (ปี.ง.59)	CX	4,864,163.38	505,572.00	-	505,572.00	-	-	505,572.00	-
60	สหพร.	ผูกพันข้ามปี	โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ ๓๐๐ มม. จำนวน 1 หน่วย	CX	194,820,000.00	194,820,000.00	-	194,820,000.00	-	-	194,820,000.00	-
					2,186,224,417.81	1,242,138,395.87	-	1,242,138,395.87	-	-	180,677,601.97	-
					133,662,560.15	454,591,269.28	-	588,253,829.43	-	-	474,223.93	-
					641,785,577.72	180,677,601.97	-	822,463,179.69	-	-	-	-

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต. *Birach Apon*

(สมมาศ พลายนแก้ว)

ผอ.สพ.สบ.ช.พร.


๑๗/๓.๖๖

วง ก
 งบประมาณ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน 24 รายการ

หน่วย: ล้านบาท

	วงเงิน	วงเงิน ปี งบ.66	อำนาจผู้อนุมัติ	สถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ปัจจุบัน
	950,000,000.00	190,000,000.00	ปล.กท.	อยู่ระหว่างประกาศ/ออกหนังสือเชิญชวน
	1,815,000,000.00	363,000,000.00	ปล.กท.	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
	736,500,000.00	147,300,000.00	ปล.กท.	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
	997,000,000.00	199,400,000.00	ปล.กท.	อยู่ระหว่าง ปล.กท.อนุมัติ
	448,000,000.00	448,000,000.00	ปล.กท.	รอลงนามในสัญญา
ว.ชลบุรี	208,019,480.00	41,603,900.00	ผบ.ทสส.	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.เห็นชอบ
	150,000,000.00	30,000,000.00	ผบ.ทสส.	อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
	125,000,000.00	25,000,000.00	ผบ.ทสส.	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.เห็นชอบ
	204,000,000.00	204,000,000.00	ผบ.ทสส.	อยู่ระหว่าง ผบ.ทสส.อนุมัติ
	162,000,000.00	32,400,000.00	ผบ.ทร.	อยู่ระหว่างประกาศ/ออกหนังสือเชิญชวน
	95,000,000.00	19,000,000.00	ผบ.ทร.	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
	287,267,000.00	114,906,800.00	ผบ.ทร.	ทร.จม.เสนอ LOA ให้ ทร. พท.ทร. เสนอหน่วยพิจารณา
	27,900,000.00	27,900,000.00	ผบ.ทร.	อยู่ระหว่างยื่นซองเสนอราคา
	68,000,000.00	68,000,000.00	ผบ.ทร.	รอลงนามในสัญญา
	65,000,000.00	65,000,000.00	ผบ.ทร.	อยู่ระหว่างยื่นซองเสนอราคา
	26,000,000.00	26,000,000.00	ผบ.ทร.	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
	32,000,000.00	32,000,000.00	ผบ.ทร.	รอลงนามในสัญญา
	65,000,000.00	65,000,000.00	ผบ.ทร.	รอลงนามในสัญญา
น 1 หลัง	50,000,000.00	50,000,000.00	ผบ.ทร.	อยู่ระหว่าง ทน.หน่วยงานเห็นชอบ
	115,700,000.00	115,700,000.00	ผบ.ทร.	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
	58,850,000.00	58,850,000.00	ผบ.ทร.	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
	45,000,000.00	45,000,000.00	ผบ.ทร.	อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณา
	12,000,000.00	12,000,000.00	ผบ.ทร.	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
	12,000,000.00	12,000,000.00	ผบ.ทร.	อยู่ระหว่าง ผบ.ทร.อนุมัติ
	6,755,236,480.00	2,392,060,700.00		

66 (เกินอำนาจอนุมัติ หน.หน่วย) วงเงิน 4,345,001,380 บาท

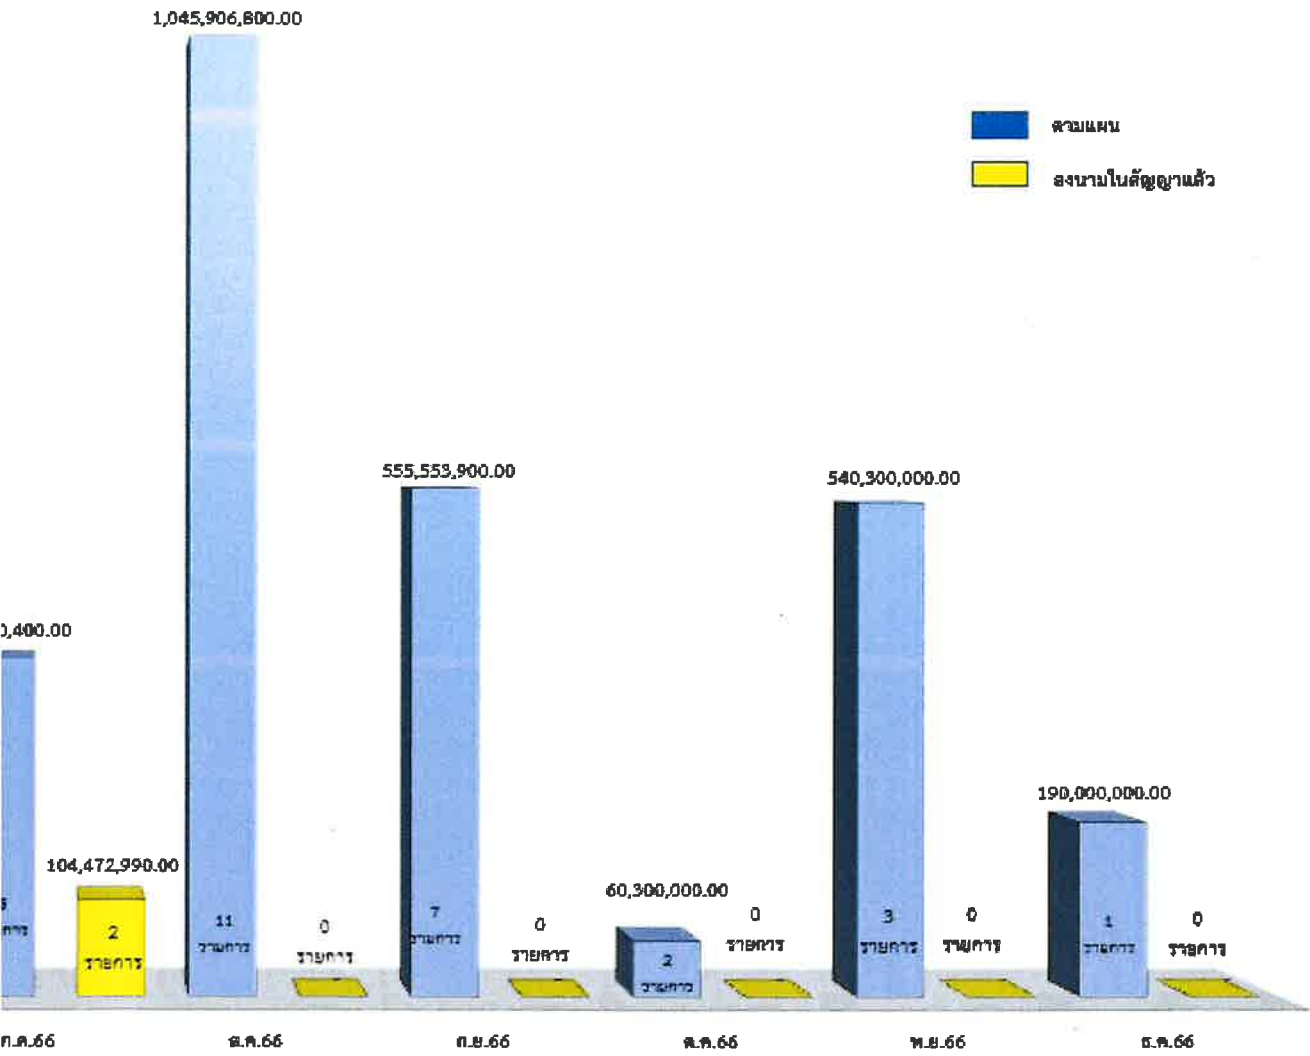

ตรวจถูกต้อง
 พล.ร.ต. *Diran Hanu*
 (สมภาค พลายแก้ว)
 ผอ.สภ.สปช.ทร.
 ๑๑ ส.ค.๖๖

จ่าย ปี 65 (ปิดยอด ณ 31 ก.ค.66)

แผนการเบิกจ่าย									
6	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	รวม	ทับตก
-	-	-	-	-	-	22,804,568.35	1,567,804,661.46	1,590,609,229.81	-
7,034.40	137,232,563.20	139,034,112.40	204,639,894.90	113,408,291.40	39,541,891.20	14,171,386.85	129,532,752.46	1,025,717,507.66	-
-	-	5,720,500.00	-	17,668,393.95	119,737,610.16	631,207.47	-	147,257,211.58	-
-	-	-	-	-	-	-	140,739,768.28	140,739,768.28	-
-	-	-	-	5,940,000.00	30,602,000.00	-	87,939,696.30	124,481,696.30	-
0,635.68	1,790,538.00	1,382,680.75	2,240,204.00	10,500,000.00	370,000.00	238,505.30	50,885,008.00	79,542,078.93	-
-	-	-	-	34,458,148.30	20,790,000.00	-	2,569,000.00	57,817,148.30	-
1,620.00	-	13,211,137.84	-	7,539,750.00	10,192,320.88	-	-	34,152,798.72	-
-	-	-	29,553.40	3,380,637.65	27,818,947.01	-	-	31,229,138.06	-
-	-	-	-	7,888,620.65	-	-	-	7,888,620.65	-
-	-	-	380,000.00	-	-	-	506,700.00	506,700.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290.08	139,023,101.20	159,349,430.99	207,289,652.30	200,783,841.95	249,052,769.25	37,845,667.97	1,979,977,586.50	3,239,941,898.29	-

ตรวจถูกต้อง
 พล.ร.ต. *Dana Arino*
 (สมมาศ พลายแก้ว)
 ผอ.สงป.สปช.ทร.
 ๑๗ ส.ค.๖๖

ไป และแผนความต้องการงบประมาณสำหรับจ่ายคืนให้แก่คู่สัญญากรณีงดหรือลดค่าปรับ

น งการ หรือ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน				การจัดสรรงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ ชดเชยเงินทับ (สพ.ท.ดำเนินการ)	หมายเหตุ
	ความต้องการ งบประมาณปี 66	ความต้องการ งบประมาณปี 67	รวมปี งบ.66/67	ยังไม่มี ความชัดเจน			
34.03	311,382,712.88	133,662,560.15	445,045,273.03	410,855,339.00	143,340,662.37		
009.37	-	67,766,009.37	67,766,009.37				มีเงินกันปี 65 และงบประมาณปี 66
10.00	-	21,946,610.00	21,946,610.00				มีเงินกันปี 65 และงบประมาณปี 66
10.75	-	3,700,910.75	3,700,910.75				เบิกแทน ครชล. มีเงินกันปี 65 และงบประมาณปี 66
00.00	-			55,000,000.00			บอกเลิกสัญญาขอความชัดเจนว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่
00.00	-			40,672,500.00			บอกเลิกสัญญาขอความชัดเจนว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่
90.03	-	36,415,990.03	36,415,990.03				ยังไม่มีข้อยุติเรื่องเครื่องยนต์ และมีเงินกันปี 65 โครงการงบปี 67
339.00	-			179,887,839.00			อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ของ สพ.ท.
00.00	-			55,410,000.00			อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ของ สพ.ท.
00.00	-			79,885,000.00			อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ของ สพ.ท.
03.74	47,640,303.74		47,640,303.74				
00.00	44,955,000.00		44,955,000.00		44,955,000.00		ทร.110 (3)
98.88	2,088,598.88		2,088,598.88				
00.00	53,874,000.00		53,874,000.00				
66.00	3,766,466.00		3,766,466.00		3,766,466.00		ทร.110 (3)
30.00	41,595,430.00		41,595,430.00		41,595,430.00		ทร.110 (2)
020.00	33,395,020.00		33,395,020.00				
00.23	9,120,700.23		9,120,700.23				
00.00	7,201,100.00		7,201,100.00				
10.00	12,750,510.00		12,750,510.00		12,750,510.00		ทร.110 (3)
00.00	4,725,000.00		4,725,000.00		4,725,000.00		ทร.110 (2)
66.25	9,394,466.25		9,394,466.25		9,394,466.25		ทร.110 (2)
94.07	7,480,694.07		7,480,694.07		7,835,522.00		ทร.110 (3)
00.00	7,473,200.00		7,473,200.00				
77.50	-	3,011,077.50	3,011,077.50				เบิกแทน ครชล. มีเงินกันปี 65 และงบประมาณปี 66
83.36	6,016,083.36		6,016,083.36		3,367,275.99		ทร.110 (3) + (5)
00.88	4,082,100.88		4,082,100.88		3,974,499.00		ทร.110 (3)
11.44	3,977,511.44		3,977,511.44		4,162,604.63		ทร.110 (2)
22.00	-				2,683,722.00		ทร.110 (3)
73.23	2,458,073.23		2,458,073.23		3,088,404.42		ทร.110 (2)
67.26	1,677,467.26		1,677,467.26				
00.00	-	50,400.00	50,400.00				
62.50	-	771,562.50	771,562.50				เบิกแทน ครชล. มีเงินกันปี 65 และงบประมาณปี 66
88.54	719,988.54		719,988.54		1,041,762.08		ทร.110 (2) + (4)
99.00	6,990,999.00		6,990,999.00				
61.84	143,198,556.40	-	143,198,556.40	230,930,238.72	36,826,939.60		
00.00	8,870,000.00		8,870,000.00				
01.10	-			6,881,201.10			
81.97	4,849,481.97		4,849,481.97				
60.79	3,220,860.79		3,220,860.79		3,162,338.67		ทร.110 (2)
00.00	2,485,000.00		2,485,000.00				
59.10	825,759.10		825,759.10				
00.00	894,000.00		894,000.00		894,000.00		ทร.110 (3)
44.00	20,029,089.79		20,029,089.79		20,029,090.00		ทร.110 (3)
38.49	11,061,068.66		11,061,068.66		10,108,287.00		ทร.110 (3)
00.00	-			354,000.00			อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ของ สพ.ท.
08.09	5,720,439.26		5,720,439.26				
96.60	-			2,307,296.60			อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ของ สพ.ท.

ปีงบประมาณ หรือ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน				การจัดสรรงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ ชดเชยเงินปี (ส.ป.ช.ดำเนินการ)	หมายเหตุ
	ความต้องการ งบประมาณปี 66	ความต้องการ งบประมาณปี 67	รวมปี งบ.66/67	ยังไม่มีความชัดเจน			
500.00	-	-	-	6,500.00			อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ของ ส.ป.ช.
299.96	12,374,299.96		12,374,299.96				
780.00	-	-	-	411,780.00			
000.00	40,637,626.15		40,637,626.15		2,159,000.00	ท.ร.110 (3)	
990.33	-	-	-	2,974,990.33			
750.00	27,841,750.00		27,841,750.00				
690.45	854,690.45		854,690.45				
366.68	2,902,866.68		2,902,866.68				
899.94	-	-	-	6,021,899.94			
371.00	-	-	-	9,113,371.00			
199.75	-	-	-	8,039,199.75			
051.59	126,051.59		126,051.59				
572.00	505,572.00		505,572.00		474,223.93	ท.ร.120 (1)	
000.00	-	-	-	194,820,000.00			
95.87	454,581,269.28	133,662,560.15	588,243,829.43	641,785,577.72	180,167,601.97		

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต. *สมชาย งาม*

(สมมาศ พลายนแก้ว)

ผอ.สงป.ส.ป.ช.ท.ร.

๑๓ ส.ค.๖๖



บันทึกข้อความ

สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารเรือ
เลขรับ ๑๒๑๒
วันที่ ๓ ส.ค. ๖๖
เวลา ๑๕.๕๐

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. (โทร. ๕๔๔๔๓)
ที่ ๕๖ /๖๖ วันที่ ๓ ก.ค.๖๖

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ครั้งที่ ๑๐/งป.๖๖
เรียน รอง ผบ.ทร. ประธานกรรมการฯ

ตามที่ รอง ผบ.ทร. ประธานกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ได้อนุมัติจัดและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๐/งป.๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม บก.ทร. ชั้น ๖ พื้นที่วังนันทอุทยาน และผ่านระบบ RTN Meeting นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำมติที่ประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามผนวก จึงเห็นควร อนุมัติมติที่ประชุมฯ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งมติที่ประชุมดังกล่าว ให้หน่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

พล.ร.ท.

ปช.ทร.

กรรมการและเลขานุการฯ

อนุมัติ

พล.ร.อ.

จจ ผบ.ทร.

พร.ต.ท.ท.ท.ท.

๓ ส.ค.๖๖

ผนวก

สรุปมติและเรื่องสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ครั้งที่ ๑๐/งป.๖๖
เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๖ ณ ห้องประชุม บก.ทร. ชั้น ๖ พื้นที่วังนันทอุทยานและผ่านระบบ RTN Meeting

มติและเรื่องสั่งการจากการประชุม

๑. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามและประสานการปฏิบัติกับกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี ๖๖ ไว้เบิกเหลือในปี และชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการถือปฏิบัติต่อไป

๒. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งปฏิทินและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. ประจำปีงบประมาณ ๖๗
ตามที่ ทร.อนุมัติ ให้หน่วยต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

๓. ให้ สปช.ทร.พิจารณาติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานด้านงบประมาณ รายการจ้างสร้างเรือ
ปฏิบัติการอุทกศาสตร์ ในการนำเรียน นรม.ให้รับทราบผลการประกวดราคา ก่อนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง/
ลงนามในสัญญา เนื่องจากเป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ เริ่มใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๖๖ ที่มีวงเงินรวม
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป เพื่อให้สามารถดำเนินการจนถึงขั้นลงนามในสัญญาได้ทันภายใน
๓๐ ก.ย.๖๖

๔. ให้ สปช.ทร. ติดตามผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการ รายการจ้างก่อสร้าง
สิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน ปตอ. กรม ป. พล.นย. ฯ จากสำนักงบประมาณ และแจ้งผล
การพิจารณาให้ ชย.ทร.ทราบ เพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและคาดว่าจะได้ตัวผู้ประกอบได้ภายใน
๓๐ ก.ย.๖๖ ตามแผนการดำเนินงานที่ ชย.ทร.กำหนดไว้

๕. ให้ ชย.ทร.วางแผนเตรียมการรองรับ กรณีไม่มีผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา โครงการ
ซ่อมปรับปรุงกระโจมไฟเกาะโลซิน จว.ปัตตานี ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้และสามารถลงนามในสัญญา
ได้ทันใน ก.ย.๖๖

ตรวจถูกต้อง

พล.ร.ต. *Dana Arso*

(สมมาศ พลายแก้ว)

ผอ.สงป.สปช.ทร.

กรรมการและ ผช.เลขานุการฯ

๒๖ ก.ค.๖๖



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

สำนักงานปลัดบัญชาการเรือ
เลขที่..... ๕๑๘๖
วันที่..... ๑๕ ธ.ค. ๖๖
เวลา..... ๑๖.๕๖

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณฯ (โทร. ๕๔๙๗๕)

ที่ กท ๐๕๐๖.๓/๘๖ วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๖ ประจำปีเดือน ก.ค.๖๖

เรียน ปช.ทร. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือ

๑. ตามที่ ผบ.ทร.ได้กรุณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือ ตามคำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๓๖๙/๒๕๖๕ ลง ๒๕ พ.ค.๖๕ โดยมีรอง ผบ.ทร.เป็นประธานฯ ซึ่งกำหนดให้รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้ ทร.ทราบทุกสิ้นเดือน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๖ ประจำปีเดือน ก.ค.๖๖ (ปิดยอด ณ ๒๗ ก.ค.๖๖) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามผนวกที่แนบ


๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ร.ต. 
ผอ.สทบ.กบ.ทร.

ผช.เลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร.

- ทราบ

พล.ร.ท. 
ปช.ทร.
๑๕ ก.ค. ๖๖

ผนวก ก

รายการที่วงเงินอนุมัติเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยถึงงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)	ประกาศแผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบรายงาน ขอซื้อ/จ้าง	เชิญชวน	เสนอราคา	ผู้มาจากอนุมัติ ขอ/จ้าง	ลงนามในสัญญา
1	ชย.พร.	30	1,936,330,300.00	29	30	27	25	23	18	15
2	สยป.พร.	4	1,183,400,000.00	4	4	4	4	4	1	
3	อร.	5	245,536,480.00	5	5	5	5	5	5	5
4	กบร.กร.	3	378,550,000.00	3	3	3	3	3		
5	สพ.พร.	6	551,408,300.00	6	6	6	6	5	5	5
6	ชส.พร.	10	310,008,000.00	10	10	10	10	10	9	9
7	อถ.พร.	6	92,744,300.00	6	6	6	6	6	6	6
8	สสพ.พร.	1	35,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1
9	รพ.สส.	1	65,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1
10	อจปร.อร.	1	42,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1
รวม		67	4,839,977,380.00	66	67	64	62	59	47	43
		คิดเป็นร้อยละ		99%	100%	96%	93%	88%	70%	64%

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(พิสิทธิ์ แดงเผือก)

ผอ.กสบ.สทบ.กบ.พร.

พ ส.ค.๖๒

อนุผนวก ๑ ของ ผนวก ก
 อำนาจ ปลดท. จำนวน ๕ รายการ

ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ.(บาท)	วิธี	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง							งบ.ทร.	เห็นชอบ	งบ.ทร.ล.	ปล.กท.อนุมัติ	ลงนามในสัญญา	บันทึก PO	ทราเวลลิ่ง งบ.
				ประกาศแผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง	ประกาศ/ออกหนังสือเชิญชวน	ยื่นของเสนอราคา	หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ	เห็นชอบ							
โครงการผูกพันใหม่																	
1	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการกองทัพบกหรือ ขนาด 325 ครอบครัวยุคใหม่พื้นที่ทุ่งทานตะวัน หรือสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง	950,000,000	ป.	25 ต.ค.65	31 ม.ค.66	22 มิ.ย.66	18 ส.ค.66	15 ก.ย.66	25 ก.ย.66	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ธ.ค.66	ธ.ค.66			งบ.ทร.
2	จ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ปอ. กรมจ.พล.มย. ตำบลลำกทอน อำเภอบ้านยาง จังหวัดระยอง 1 งานงบประมาณทั้งสิ้น 1,815,000,000 บาท	1,815,000,000	ป.	ส.ค.66	11 พ.ค.66	ส.ค.66	ส.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	พ.ย.66	พ.ย.66		งบ.ทร.
3	โครงการพัฒนาขีดความสามารถที่เทียบเรือ สุท.พง.ทรภ.3 ระยะที่ 1	736,500,000	ป.	25 ต.ค. 65	30 มิ.ย. 66	9 ส.ค.66	9 ส.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ต.ค.66	พ.ย.66	พ.ย.66			งบ.ทร.
4	โครงการจัดหาเรือปฏิบัติการยุทธศาสตร์																
	- ปี 66 จัดสรร 199,400,000 บาท																
	- ปี 67 จัดสรร 398,800,000 บาท	997,000,000	ค.	25 พ.ย.65	12 พ.ค.66	12 พ.ค.66	15 พ.ค.66	22 พ.ค.66	8 มิ.ย.66	22 มิ.ย.66	19 ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	ก.ย.66			งบ.ทร.
	- ปี 68 จัดสรร 398,800,000 บาท																
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ 7,000,000 บาท																
โครงการต่อเนื่อง/สืบ																	
	โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบกที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ 66																
5	โครงการจัดหาอาหารเสริมกระป๋อง (8x8) ชนิดสำเร็จรส จำนวน 7 ตัน	448,000,000	ค.	16 ต.ค. 65	23 ม.ค. 66	23 ม.ค. 66	24 ม.ค. 66	27 ก.พ. 66	22 มี.ค.66	28 เม.ย.66	1 มิ.ย.66	25 ก.ค.66	ส.ค.66	ส.ค.66			งบ.ทร.

ตรวจถูกต้อง
 น.อ. (พิเศษ) แดงเผือก
 ผอ.กอบ.สท.บ.ทร.

ส.ค.๖๖

อนุแผนก ๒ ของ แผนก ก
 อนุาง แผนก๑๑. จำนวน ๘ รายการ

ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ. (บาท)	วิธี	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง							วันที่	PO	หมายเหตุ	
				ประกาศ ประกวด	อนุมัติ TOR	เริ่มขอบ ราคาขอ ซื้อ/ขอจ้าง	ประกาศ/ออก หนังสือเชิญชวน	ยื่นซองเสนอ ราคา	หัวหน้า หน่วยงาน เห็นชอบ	มอบ เงิน				มอบ พัสดุ
1	จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริการ กรมอู่ทหารอากาศทหารเรือ พร้อมอาคารบริวาร สิ่ง ปลูกสร้างตามสัญญา 208.019.480 บาท ปี 66 ของตั้งงบประมาณ 41,603,900 บาท ปี 67 ของตั้งงบประมาณ 166,415,580 บาท	208,019,480	ป	ยกเว้น	29 มี.ค.66	19 พ.ค.66	19 พ.ค.66	2 มิ.ย.66	14 มิ.ย.66	4 พ.ค.66	4 พ.ค.66	ก.ย.66		จบ.พร.
2	จ้างซ่อมบำรุงระบบหม้อไอน้ำผลิตพลังความร้อนไฟฟ้าฯ งบประมาณรวม 142,000,000 บาท - ปี 66 จัดสรร 28,400,000 บาท - ปี 67 จัดสรร 56,800,000 บาท - ปี 68 จัดสรร 56,800,000 บาท	142,000,000	ค	ยกเว้น	17 มี.ค.65	26 มี.ค.65	27 มี.ค.65	4 พ.ย.65	15 มี.ค.65	2 มิ.ย.66	24 มี.ค.66	21 เม.ย.66		จบ.พร.
3	จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กองงานไฟฟ้าและกองงานเครื่องกล ขย.พร. - ปี 66 วงเงิน 30,000,000 บาท - ปี 67 วงเงิน 120,000,000 บาท	150,000,000	ค.	ยกเว้น	31 มี.ค.66	9 มี.ค.66	16 มี.ค.66	ก.ย.66	ก.ย.66	๓๑.๑.๖๖	๓๑.๑.๖๖	พ.ย.๖๖		จบ.พร.
4	จ้างก่อสร้างรั้วป้องกันและซ่อมเครื่องปั้น ฝูงบิน 203 กองบิน 2 กองการบิน ทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกจาก - ปี 66 วงเงิน 25,000,000 บาท - ปี 67 วงเงิน 100,000,000 บาท	125,000,000	ค.	ยกเว้น	5 เม.ย.66	12 พ.ค.66	12 พ.ค.66	31 พ.ค.66	29 มิ.ย.66	๑๑.๑.๖๖	๑๑.๑.๖๖	ก.ย.๖๖		จบ.พร.
โครงการพิเศษ/พิเศษ														
5	โครงการจัดการขนถ่ายสินค้าท่าอากาศยานดอนเมือง	150,000,000	ค	11 มี.ค.65	23 พ.ย.65	26 มี.ค.65	20 มี.ค.66	2 มี.ค.66	23 มี.ค.65	27 พ.ค.66	20 มิ.ย.66	17 ก.ค.66		จบ.พร.
6	จ้างซ่อมทำนบกึ่งรั้วรั้วใหญ่ ซากา - ซ้าย คราอีจอร์ MTU รุ่น 12V 1163 TB 93 ชิ้น MAJOR OVERHAUL ระบายขนาด จำนวน 1 งาน	84,200,000	ฉ.	23 ก.ย.65	11 พ.ย.65	21 พ.ย.65	22 พ.ย.65	29 พ.ย.65	26 มี.ค.65	23 มี.ค.66	19 เม.ย.66	27 เม.ย.66		จบ.พร.
7	จ้างซ่อมทำนบกึ่งรั้วรั้วใหญ่ ซากา - ซ้าย คราอีจอร์ MTU รุ่น 20V 1163 TB 62 ชิ้น MAJOR OVERHAUL ระบาย จำนวน 1 งาน	92,000,000	ฉ.	23 ก.ย.65	11 พ.ย.65	21 พ.ย.65	22 พ.ย.65	29 พ.ย.65	26 มี.ค.65	23 มี.ค.66	19 เม.ย.66	27 เม.ย.66		จบ.พร.
8	จ้างรับบำรุงสภาพ (RECOVER) ยกลด (S-76B) หมายเลข 2308	204,000,000	ค	20 ก.ย.65	9 มี.ค.66	25 มี.ค.66	26 มี.ค.66	2 มิ.ค.66	22 มี.ค.66	22 มิ.ย.66	๑๑.๑.๖๖	๑๑.๑.๖๖		จบ.พร.

ตรวจถูกต้อง
 น.อ. (พิเศษ) และ (เอก)
 ผอ.กมล.สท.น.กบ.พร.
 ส.ศ.๖๖

อนุผนวก ๓ ของ ผนวก ก
 อำนาจ ผนวก ๒. จำนวน และ รายการ

ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ. (บาท)	วิธี	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง							อนุมัติ	สถานะในปัจจุบัน	PO	พัสดุ จ.ป.	
				ประกาศแผนงาน	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ ราชกิจจานุเบกษา/ข้อสั่ง	ประกาศ/ออก หนังสือเชิญชวน	ยื่นซองเสนอราคา	ทำทำ หน่วยงาน เห็นชอบ	ตั้งสัญญา ก.บ.ท.ร.					อนุมัติ
โครงการลงทุนเงิน															
1	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการของพื้นที่ภูเรือ ขนาด 79 ครอบครัวยุคใหม่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง -ปี 66 วงเงิน 32,400,000 บาท -ปี 67 วงเงิน 129,600,000 บาท	142,000,000	ป	25 ต.ค.65	31 พ.ค.66	26 ต.ค.66	7 ส.ค.66	8 ต.ค.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ก.ย.66	ค.ค.66	ค.ค.66	ชบ.ท.ร.
2	โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการของพื้นที่ภูเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง -ปี 66 วงเงิน 19,000,000 บาท -ปี 67 วงเงิน 76,000,000 บาท	95,000,000	ป	25 ต.ค.65	28 เม.ย.66	7 มิ.ย.66	7 มิ.ย.66	13 ก.ค.66	25 ก.ค.66	ก.ย.66	11 ส.ค.66	31 ส.ค.66		ชบ.ท.ร.	
3	โครงการจัดทำพาสปอร์ตระบบควบคุมคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 ระบบ -ปี 66 วงเงิน 114,906,800 บาท -ปี 67 วงเงิน 122,360,200 บาท	287,267,000	FMS	11 ต.ค.65	24 มิ.ย.66	ก.พ.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ส.ค.66	ส.ค.66	ส.ค.66	ส.ค.66	ส.ค.66	ชบ.ท.ร.	

โครงการต่อเนื่องปีถัดไป

ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ. (บาท)	วิธี	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง										ณ.พ.ร. อนุมัติ	ลงนามในสัญญา	PO	พร้อมต่อ จ.ป.
				ประกาศโฆษณา	อนุมัติ TOR	กำหนดวงเงินของสัญญา/พัสดุจ้าง	ประกาศ/ออกหนังสือเชิญชวน	ยื่นซองเสนอราคา	หัวหน้าหน่วยงานเสนอ	เสร็จสิ้น ก.บ.ท.ร.							
4	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคาร 64 ครอบคลุม 7 หลัง 3 หลังเสร็จก่อนความเสียหาย และระบบอาคารชุด 3 ลำดับงาน ๑ หลังพร้อม ๑ หลัง จำนวน 1 หลัง	80,000,000	ป	ยกเว้น	19 มิ.ย.66	31 มิ.ย.66	1 ก.ค.66	10 ก.ค.66	17 มิ.ย.66		7 มิ.ย.66	15 มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			
5	การก่อสร้างอาคารชั้น ๒ อาคาร ๖๔ ครอบคลุม ๑๒ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน 1 หลัง	80,000,000	ป	14 มิ.ย.66	9 ก.ค.66	27 มิ.ย.66	7 ก.ค.66	9 มิ.ย.66	20 มิ.ย.66		15 มิ.ย.66	14 ก.ค.66		๑๒.พ.ร.			
6	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (SCOD) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบอาคารชุด ๓ ลำดับงาน ๓ หลัง จำนวน 1 หลัง	24,000,000	ป	๒๓ มิ.ย.	20 มิ.ย.66	31 มิ.ย.66	6 ก.ค.66	15 ก.ค.66	23 มิ.ย.66		8 พ.ค.66	13 มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			
7	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคาร ๖๔ ครอบคลุม ๑๒ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน 1 หลัง	80,000,000	ป	๒๓ มิ.ย.	19 มิ.ย.66	31 มิ.ย.66	6 ก.ค.66	15 มิ.ย.66	22 มิ.ย.66		8 พ.ค.66	12 มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			
8	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคาร ๖๔ ครอบคลุม ๑๒ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน 1 หลัง	80,000,000	ป	2๑ ก.ค.66	9 มิ.ย.66	31 มิ.ย.66	7 ก.ค.66	9 มิ.ย.66	26 มิ.ย.66		15 มิ.ย.66	14 ก.ค.66		๑๒.พ.ร.			
9	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคาร ๖๔ ครอบคลุม ๑๒ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน 1 หลัง ๑.๒ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน 2 หลัง	40,000,000	ป	25 ก.ค.66	18 ก.ค.66	31 ก.ค.66	8 พ.ค.66	30 พ.ย.65	23 ก.ค.66		10 มิ.ย.66	20 มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			
10	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคาร ๖๔ ครอบคลุม ๑๒ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารชุด ๓ ลำดับงาน ๓ หลัง จำนวน 2 หลัง	82,๘๐๐,๐๐๐	ป	๒๓ มิ.ย.	9 ก.ค.66	10 มิ.ย.66	11 มิ.ย.66	20 มิ.ย.66	16 มิ.ย.66		19 มิ.ย.66	6 มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			
11	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคาร ๖๔ ครอบคลุม ๑๒ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน 1 หลัง	27,9๐๐,๐๐๐	ป	๒๓ มิ.ย.	21 มิ.ย.66	19 มิ.ย.66	21 มิ.ย.66	9 มิ.ย.66	๑๑ มิ.ย.66		๑๑ มิ.ย.66	๑๑ มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			
12	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคาร ๖๔ ครอบคลุม ๑๒ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน 1 หลัง	42,500,000	ป	๒๓ มิ.ย.	30 พ.ย.65	21 ก.ค.66	22 ก.ค.65	4 มิ.ย.66	26 มิ.ย.66		2 มิ.ย.66	20 มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			
13	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคาร ๖๔ ครอบคลุม ๑๒ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน 1 หลัง	50,000,000	ป	๒๓ มิ.ย.	2 ก.พ.66	19 มิ.ย.66	16 ก.พ.66	26 ก.พ.66	23 มิ.ย.66		13 ก.ค.66	16 มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			
14	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคาร ๖๔ ครอบคลุม ๑๒ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน 1 หลัง	21,550,000	ป	25 ก.ค.66	20 ก.พ.66	12 มิ.ย.66	12 มิ.ย.66	3 มิ.ย.66	31 พ.ค.66		14 มิ.ย.66	23 มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			
15	งานก่อสร้างอาคารชุด ๓ ลำดับงาน	68,๐๐๐,๐๐๐	ป	๒๓ มิ.ย.	22 มิ.ย.66	12 มิ.ย.66	12 มิ.ย.66	26 พ.ค.66	16 มิ.ย.66		24 มิ.ย.66	18 มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			
16	โครงการก่อสร้างอาคาร ๖๓.๖๖ และระบบอาคารชุด ๓ ลำดับงาน ๓ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน ๑ หลัง	65,๐๐๐,๐๐๐	ป	๒๓ มิ.ย.	25 พ.ค.66	20 มิ.ย.66	20 มิ.ย.66	3 มิ.ย.66	๑๑ มิ.ย.66		๑๑ มิ.ย.66	๑๑ มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			
17	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคาร ๖๔ ครอบคลุม ๑๒ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน 1 หลัง	26,๐๐๐,๐๐๐	ป	๒๓ มิ.ย.	27 มิ.ย.66	19 พ.ค.66	20 พ.ค.66	16 มิ.ย.66	7 มิ.ย.66		๑๑ มิ.ย.66	๑๑ มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			
18	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคาร ๖๔ ครอบคลุม ๑๒ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน 1 หลัง	๒2,๐๐๐,๐๐๐	ป	๒๓ มิ.ย.	19 มิ.ย.66	31 พ.ค.66	6 มิ.ย.66	15 มิ.ย.66	17 มิ.ย.66		1 มิ.ย.66	31 พ.ค.66		๑๒.พ.ร.			
19	งานก่อสร้างอาคาร ๖๓.๖๖ ที่ 1 พื้น ๖.๖๖ จำนวน ๑ หลัง	35,๐๐๐,๐๐๐	ป	๒๓ มิ.ย.	3 ก.พ.66	16 มิ.ย.66	17 ก.พ.66	27 มิ.ย.66	23 มิ.ย.66		8 พ.ค.66	12 มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			
20	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคาร ๖๔ ครอบคลุม ๑๒ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน 1 หลัง	32,๐๐๐,๐๐๐	ป	15 มิ.ย.66	2 มิ.ย.66	12 มิ.ย.66	12 มิ.ย.66	5 พ.ค.66	31 พ.ค.66		29 มิ.ย.66	11 มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			
21	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคาร ๖๔ ครอบคลุม ๑๒ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน 1 หลัง	65,๐๐๐,๐๐๐	ป	15 มิ.ย.66	21 ก.พ.66	12 มิ.ย.66	12 มิ.ย.66	16 พ.ค.66	16 มิ.ย.66		24 ก.ค.66	15 มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			
22	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคาร ๖๔ ครอบคลุม ๑๒ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน 1 หลัง	35,๐๐๐,๐๐๐	ป	๒๓ มิ.ย.	21 ก.ค.66	1 มิ.ย.66	1 มิ.ย.66	15 มิ.ย.66	15 มิ.ย.66		23 มิ.ย.66	21 มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			
23	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอาคาร ๖๔ ครอบคลุม ๑๒ หลัง ๒.๒ หลัง จำนวน 1 หลัง	50,๐๐๐,๐๐๐	ป	๒๓ มิ.ย.	21 มิ.ย.66	22 มิ.ย.66	22 มิ.ย.66	21 มิ.ย.66	9 มิ.ย.66		25 ก.ค.66	12 มิ.ย.66		๑๒.พ.ร.			

ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ. (บาท)	ปี	ขั้นตอนการก่อสร้าง							งบฯ อนุมัติ	งบฯ อนุมัติ	PO	หน่วยถือ 411
				ประกาศแผนฯ	อนุมัติ TOR	เพิกถอนร่างงานของซื้อ/จ้าง	ประกาศ/ออกหนังสือเชิญฯ	ตั้งงบประมาณราคา	หัวหน้าหน่วยงาน	เสร็จสิ้นงบ.ทร.				
24	จ้างรับปรุงอาคารสำนักงานและสำนักงานรวมของกองทัพบกสำนักงานที่ 11 กรมต่อสู้ อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้ทางอากาศรวมสะท้านฟ้า จังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรี	30,700,400	ป	13 มี.ค. 66	18 ก.ย. 66	12 มี.ค. 66	12 มี.ค. 66	3 มี.ค. 66	31 พ.ค. 66		26 มี.ค. 66	26 ก.พ. 66		อ.พ.ทร.
25	จัดซื้อ CTG 7.62 MM 49AL M80 1TR AM2 LINKED	48,000,000	ค	27 ก.ค. 65	31 ก.ค. 65	4 พ.ย. 65	10 พ.ย. 65	26 ธ.ค. 65	17 มี.ค. 66		21 ก.พ. 66	13 มี.ค. 66		อ.พ.ทร.
26	จัดซื้อ CTG 5.56 MM BALL M193 จำนวน 3,000,000 EA	39,000,000	ค	14 ก.ย. 65	28 ต.ค. 65	28 ต.ค. 65	28 ต.ค. 65	7 ต.ค. 65	6 มี.ค. 66		20 ก.พ. 66	13 มี.ค. 66		อ.พ.ทร.
27	โครงการจัดหาระบบตรวจการณ์ภาคพื้นดิน สหพันธ์เรือ ตก-กอป	99,091,500	ค	11 ต.ค. 65	18 พ.ย. 65	19 ต.ค. 65	9 ต.ค. 65	26 มี.ค. 66	7 มี.ค. 66		9 มี.ค. 66	30 มี.ค. 66		อ.พ.ทร.
28	โครงการจัดหาขบวนรถตรวจการณ์ภาคพื้นดิน สหพันธ์เรือ ตก-กอป	99,510,000	ค	11 ต.ค. 65	18 พ.ย. 65	9 ต.ค. 65	9 ต.ค. 65	26 มี.ค. 66	7 มี.ค. 66		15 มี.ค. 66	14 มี.ค. 66		อ.พ.ทร.
29	โครงการปรับปรุงระบบประปาพื้นที่ลุ่มต่ำ ระยะที่ 3	65,000,000	ป	10 ก.ย. 65	28 ต.ค. 65	28 ต.ค. 65	31 ต.ค. 65	7 พ.ค. 66	15 พ.ย. 65		14 ก.พ. 66	2 มี.ค. 66		อ.พ.ทร.
30	จ้างช่างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ไม่รวมระบบอาอู)	56,826,480	ค	6 ก.ค. 65	22 พ.ย. 65	2 ก.ค. 65	7 ต.ค. 65	27 ธ.ค. 65	23 ธ.ค. 65		3 พ.ย. 65	28 มี.ค. 66		อ.พ.ทร.
31	จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ศูนย์บัญชาการป้องกันภัย หน่วยงาน 1 - 3 ศาลากลาง CATERPILLAR รุ่น 3508 B ร.ม.พ.พล.ล. จำนวน 215 รายการ	12,210,000	ค	23 ก.ย. 65	21 พ.ย. 65	25 พ.ย. 65	25 พ.ย. 65	8 ต.ค. 65	23 ธ.ค. 65		21 มี.ค. 66	29 มี.ค. 66		อ.พ.ทร.
32	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แม่แบบทองแดงแบบ 2 มิติ (Send Printing) จำนวน 1 รายการ	30,000,000	ค	17 มี.ค. 66	26 มี.ค. 66	26 มี.ค. 66	26 มี.ค. 66	5 มี.ค. 66	10 มี.ค. 66		26 มี.ค. 66	26 ก.ย. 66		อ.พ.ทร.
33	จ้างซ่อมพลาสมาเชื่อมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ร.ล.ส.ล.ล.	42,000,000	ค	24 ก.ย. 65	15 พ.ย. 65	2 ต.ค. 65	6 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	23 มี.ค. 66		21 มี.ค. 66	20 มี.ค. 66		อ.พ.ทร.
34	จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองระบบเสด็จอากาศตามสถานการณ์ โครงการปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติตามระบบสื่อสารของศป.ทร.	35,000,000	ค	18 ก.ค. 65	3 พ.ย. 65	3 พ.ย. 65	4 พ.ย. 65	14 พ.ย. 65	29 พ.ย. 65		11 มี.ค. 66	3 ก.พ. 66		อ.พ.ทร.
35	จ้างรับปรุง HAWKVISION COCCOT สำหรับ ย.พ.ล. (S-708)	115,700,000	ค	29 ก.ย. 65	16 มี.ค. 66	19 มี.ค. 66	20 มี.ค. 66	18 ก.ค. 66	25 ก.ค. 66		25 ต.ค. 66	15 ก.ย. 66		อ.พ.ทร.
36	จ้างซ่อมสีระภาค (REPAIRS) บ.ศ.จ.1 หมายเลข 1311	58,850,000	ค	24 ก.ย. 65	16 มี.ค. 66	19 มี.ค. 66	20 มี.ค. 66	18 ก.ค. 66	23 ก.ค. 66		25 ต.ค. 66	15 ก.ย. 66		อ.พ.ทร.
37	จัดซื้อระบบสื่อสารแบบรายการ พร้อมติดตั้ง ให้กับ ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 1 ระบบ	35,000,000	ค	19 ก.ย. 65	20 ต.ค. 65	10 พ.ย. 65	23 พ.ย. 65	6 ต.ค. 65	14 ต.ค. 65		21 ก.พ. 66	14 มี.ค. 66		อ.พ.ทร.
38	จัดซื้อหน่วยผสมเครื่องตรวจอากาศ ศาลากลาง SAG รุ่น SEA GRAFEE AM8 ให้กับ ร.ล.ภาคพื้น จำนวน 2 รายการ	22,888,500	ค	19 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	10 พ.ย. 65	10 พ.ย. 65	13 พ.ย. 65	7 ต.ค. 65		24 พ.ย. 66	6 มี.ค. 66		อ.พ.ทร.
39	จ้างซ่อมพลาสมาเชื่อมเครื่องตรวจอากาศ ศาลากลาง SAG รุ่น SIGMA 40 ของ ร.ล.ประจำพื้นที่อ.ล. จำนวน 1 งาน	12,840,000	ค	19 ต.ค. 65	20 ต.ค. 65	10 พ.ย. 65	11 พ.ย. 65	22 พ.ย. 65	20 ต.ค. 65		31 พ.ค. 66	29 มี.ค. 66		อ.พ.ทร.
40	จ้างซ่อม TRANSMITTER & RECEIVER UNIT ของเครื่องตรวจอากาศ ศาลากลาง TERMA รุ่น SCATTER ของ ร.ล.อ.ของ จำนวน 1 งาน	9,200,000	ค	19 ต.ค. 65	20 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	23 พ.ย. 65	13 ต.ค. 65	26 ก.ย. 65		28 ก.พ. 66	26 พ.ย. 65		อ.พ.ทร.
41	จัดซื้อ SIGNAL PROCESSOR BOARD ของเครื่องตรวจอากาศ ศาลากลาง CSSC รุ่น SRS60 ให้กับ ร.ล.สายบุรี จำนวน 1 EA	6,166,500	ค	19 ต.ค. 65	25 ต.ค. 65	2 พ.ย. 65	3 พ.ย. 65	7 พ.ย. 65	7 ต.ค. 65		20 พ.ย. 66	2 มี.ค. 66		อ.พ.ทร.
42	จัดซื้อหน่วยส่งสัญญาณ ศาลากลาง THALES รุ่น TRC 9210 จำนวน 6 รายการ	6,689,300	ค	19 ต.ค. 65	31 ต.ค. 65	4 พ.ย. 65	10 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	16 ต.ค. 65		27 ก.พ. 66	17 มี.ค. 66		อ.พ.ทร.
43	จัดซื้อระบบเครื่องตรวจอากาศ 12 ชิ้น (ดีเซล) จำนวน 22 ชิ้น	29,876,000	ค	16 ต.ค. 65	6 ก.พ. 66	6 ก.พ. 66	14 ก.พ. 66	3 มี.ค. 66	13 มี.ค. 66		11 พ.ค. 66	31 พ.ค. 66		อ.พ.ทร.
44	จัดซื้อระบบเครื่องตรวจอากาศ 5 ชิ้น	23,750,000	ค	16 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	15 ต.ค. 65	6 มี.ค. 66	11 มี.ค. 66		7 ก.พ. 66	21 ก.พ. 66		อ.พ.ทร.
45	จัดซื้อขบวนรถ (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ล้อ แบบกระดุมเหล็ก จำนวน 17 คัน	35,343,000	ค	16 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	5 พ.ย. 65	25 พ.ย. 65	16 ต.ค. 65		31 มี.ค. 66	16 ก.พ. 66		อ.พ.ทร.
46	จัดซื้อขบวนรถ (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำหนัก จำนวน 8 คัน	21,064,000	ค	16 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	1 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	15 ต.ค. 65		6 ก.พ. 66	26 ก.พ. 66		อ.พ.ทร.

ลำดับ	โครงการ/งาน	วงเงิน ตาม พ.ร.บ. (บาท)	วิธี	ขั้นตอนการก่อสร้าง							งบพ.ร. อนุมัติ	งบงานในสัญญา	PO	วันที่ซื้อ จด.
				ประกาศแผนงาน	อนุมัติ TOR	ให้ขออนุมัติ/ขอจ้าง	ประกาศ/ออกหนังสือจ้าง	ยื่นขอเสนอราคา	ทำราคา	จ้างทำ				
47	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ล้อ 6 คัน จำนวน 17 คัน	23,375,000	ป.	16 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	1 ต.พ. 65	22 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65		7 ต.พ. 66	24 พ.ค. 66		อบ.พร.
48	จัดซื้อรถยก/รถตัก ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 คัน จำนวน 2 คัน	35,000,000	ป.	16 ต.ค. 65	28 ต.ค. 65	28 ต.ค. 65	24 พ.ค. 65	10 มิ.ย. 65	29 มิ.ย. 65		7 ต.พ. 66	24 ต.พ. 66		อบ.พร.
49	จัดซื้อรถบรรทุกพ่วง ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 6 คัน	21,600,000	ป.	16 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	19 ต.ค. 65	1 พ.ย. 65	23 พ.ย. 65	16 ธ.ค. 65		6 ต.พ. 66	24 ต.พ. 66		อบ.พร.
50	จัดซื้อรถดับเพลิง จำนวน 4 คัน	54,000,000	ป.	16 ต.ค. 65	4 พ.ย. 65	4 พ.ย. 65	10 มิ.ย. 66	9 ก.พ. 66	21 ก.พ. 66		29 พ.ค. 66	12 มิ.ย. 66		อบ.พร.
51	จัดซื้อรถกู้ภัยอากาศยาน จำนวน 1 คัน	21,000,000	ป.	16 ต.ค. 65	4 พ.ย. 65	4 พ.ย. 65	10 มิ.ย. 66	1 ก.พ. 66	16 ต.พ. 66		10 มิ.ย. 66	2 มิ.ย. 66		อบ.พร.
52	จัดซื้อรถเก็บเพลิงไหม้และเศษขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน	45,000,000	ป.	16 ต.ค. 65	4 พ.ย. 65	4 พ.ย. 65	10 มิ.ย. 66	31 มิ.ย. 66	27 ก.พ. 66					อบ.พร.
53	จัดซื้อเครื่องปั้นดินเผา	12,000,000	อ.	13 มิ.ย. 66	29 มิ.ย. 66	29 มิ.ย. 66	30 มิ.ย. 66	17 ก.ค. 66	25 ก.ค. 66		15 ส.ค. 66	30 ส.ค. 66		อบ.พร.
54	จัดสร้างเครื่องปั้นดินเผา	12,000,000	อ.	13 มิ.ย. 66	29 มิ.ย. 66	29 มิ.ย. 66	30 มิ.ย. 66	17 ก.ค. 66	25 ก.ค. 66		15 ส.ค. 66	30 ส.ค. 66		อบ.พร.

นางสาวสุกัญญา
 (พัสดุฯ) แสดงผล
 ผอ.กลบ.ส.ก.น.พร.
 ส.ค. ๖๖

ผนวก ข

รายการรายจ่ายลงทุน (เกิน ๑ ล้านบาท) ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยต้องประมาณ ประจำเดือน ก.ค.๖๖

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)	ประเภท แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายนาม ขอซื้อ/จ้าง	เชิญชวน	เสนอราคา	ผู้จำหน่าย อนุมัติ ซื้อ/จ้าง	ลงนามในสัญญา
1	ขย.ทร.	15	132,197,000.00	15	15	15	15	14	14	14
2	สพ.ทร.	44	223,345,150.00	44	44	44	44	44	44	44
3	อร.	11	36,613,450.00	11	11	11	11	11	11	11
4	ศกถ.พร.ทร.	47	183,883,490.00	47	47	47	47	47	47	46
5	สสพ.ทร.	13	107,475,000.00	13	13	13	13	13	13	13
6	กบร.กธ.	7	19,472,930.00	7	7	7	7	7	7	7
7	อศ.	14	36,151,500.00	14	14	14	14	14	14	14
8	พร.	3	29,900,000.00	3	3	3	3	3	3	3
9	บส.ทร.	17	109,593,200.00	17	17	17	17	17	17	17
10	พธ.ทร.	6	22,173,000.00	6	6	6	6	6	6	6
11	ยศ.ทร.	2	3,320,060.00	2	2	2	2	2	2	2
12	ฐพ.สช.ทรธ.2	1	1,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1
13	กรง.ฐพ.สส.	2	2,237,000.00	2	2	2	2	2	2	2
14	รพ.อภากาภิบาลตำรวจศ.	4	6,100,000.00	4	4	4	4	4	4	4
รวม		186	913,461,780.00	186	186	186	186	185	185	184
		คิดเป็นร้อยละ		100%	100%	100%	100%	99.46%	99.46%	98.92%

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(พสุทธิ แดงผ่อง)

ผอ.กอบ.สท.บ.ทร.

๗ ส.ค.๖๖

ผนวก ค

รายการ งบ.พร.120 (เกิน ๑ ล้านบาท) ที่วงเงินอนุมัติอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานถึงงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖

ที่	หน่วย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน(บาท)	ประกาศ แผนฯ	อนุมัติ TOR	เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อ/จ้าง	เชิญชวน	เสนอราคา	ผู้มีอำนาจ อนุมัติซื้อ/จ้าง	ลงนามในสัญญา
1	ชย.พร.	1	1,190,000.00	1	1	1	1	1	1	1
2	สพ.พร.	94	345,421,920.00	94	94	94	94	94	94	94
3	อร.	68	243,091,400.00	68	68	68	68	68	68	67
4	สพ.สส.	1	2,000,000.00	1	1	1	1	1	1	1
5	อถ.พร.	33	45,859,279.00	33	33	33	33	33	33	33
6	อศ.	2	2,200,000.00	2	2	2	2	2	2	2
7	พร.	1	1,516,000.00	1	1	1	1	1	1	1
8	สส.พร.	19	47,219,200.00	19	19	19	19	19	19	19
9	อร.พร.	29	71,766,900.00	29	29	29	29	29	29	29
10	พธ.พร.	5	20,509,271.00	5	5	5	5	5	5	5
11	อจปร.อร.	29	75,452,500.00	29	29	29	29	29	29	29
12	จศ.พร.	5	13,791,390.00	5	5	5	5	5	5	5
13	กรง.สพ.สส.	2	2,900,000.00	2	2	2	2	2	2	2
รวม		289	872,917,860.00	289	289	289	289	289	289	288
		คิดเป็นร้อยละ		100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.65%

ตรวจถูกต้อง

น.อ.

(พสุทธิ์ มั่งคั่ง)

ผอ.กสบ.สท.บ.พร.

ส.ค.๖๖



กระดาษเขียนข่าวราชาวี

แบบ สส.ทร. ๘

หน่วย รับจาก วันที่ - เวลา
 ระบบ ผู้ฝาก ผู้รับ
 จ่ายให้ ส่งต่อให้ ระบบ
 ผู้จ่าย ผู้รับ วันที่ - เวลา

ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ - ด่วน -	ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ - ปกติ -	หมู่วันที่ - เวลา ๑๐๑๕๐๖ ก.ค.๖๖	หมู่คำ
จาก ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือปี (สปช.ทร.)			ชั้นความลับ
ถึง ผู้รับปฏิบัติ กบ.ทร. สปช.ทร. สสท.ทร. สยป.ทร. กบร.กร. อร. อจปร.อร. อล.ทร. ชย.ทร. สพ.ทร. พท.ทร.(กองบริการ) ศกท.พท.ทร. อศ. รร.นร.			ชื่อของผู้ให้ข่าว
ผู้รับทราบ สน.รอง ผบ.ทร. สน.รอง เสธ.ทร. (สายงานส่งกำลังบำรุง)			กตป-๒๓ /๐๓/๖๖

เรื่อง การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือปี ครั้งที่ ๘/งป.๖๖

๑. คณะทำงานเร่งรัดและติดตามฯ ขอแจ้งกำหนดการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือปี ครั้งที่ ๘/งป.๖๖ ในวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๖ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม สปช.ทร.(๒) ชั้น ๔ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน และผ่านระบบแอปพลิเคชัน RTN Meeting โดยมี รอง เสธ.ทร. (สายงานส่งกำลังบำรุง) หรือผู้แทน เป็นประธานฯ และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ หน่วยต่าง ๆ ชี้แจงข้อมูล รายการ ความก้าวหน้า การดำเนินการสำหรับรายการเงินกันปีงบประมาณ ๖๕ ไว้เบิกเหลือปีฯ สำหรับรายการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่าย พร้อมทั้งเสนอปัญหา ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไขปัญหาตามลำดับ ดังนี้ อจปร.อร. สยป.ทร. รร.นร. กบร.กร. อร. อศ. อล.ทร. สพ.ทร. ศกท.พท.ทร. ชย.ทร.และ สสท.ทร.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

๒. ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังนี้

๒.๑ คณะทำงานฯ และผู้แทนหน่วย ได้แก่ สสท.ทร. สยป.ทร. อล.ทร. และ ชย.ทร.ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สปช.ทร.(๒) ชั้น ๔ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

๒.๒ ผู้แทนหน่วย ได้แก่ กบร.กร. อร. อจปร.อร. สพ.ทร. ศกท.พท.ทร. อศ. และ รร.นร. ร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ RTN Meeting (meeting.navy.mi.th , Meeting ID : 2601 , Passcode : 0407)

๓. ขอรับการสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ในจัดการประชุม ณ ห้องประชุม กบ.ทร. ชั้น ๖ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน ดังนี้

๓.๑ สปช.ทร. สนับสนุนห้องประชุมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่

๓.๒ พท.ทร. สนับสนุนจัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ ชุด

หน้า ๑ ของ ๒ หน้า	อ้างถึงข่าว..... ชั้นความลับ [] กำหนด [X] ไม่กำหนด	ชื่อผู้เขียนข่าว ตำแหน่ง ผอ.กตป.สงป.สปช.ทร. น.อ. โทร.๕๕๑๔๓	นายทหารอนุมัติข่าว
		ชื่อผู้รับรองข่าว พล.ร.ท. รอง เสธ.ทร.(สายงานส่งกำลังบำรุง)	



กระดาษเขียนข่าวราชข่าว

แบบ สส.ทร. ๘

หน่วยรับจาก วันที่ - เวลา

ระบบผู้ฝาก ผู้รับ

จ่ายให้ส่งต่อให้ ระบบ

ผู้จ่ายผู้รับ วันที่ - เวลา

ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ - ด่วน -	ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ - ปกติ -	หมู่วันที่ - เวลา ๑๐๑๕๐ ก.ค.๖๖	หมู่คำ
จาก			ชั้นความลับ
ถึง ผู้รับปฏิบัติ			-
ผู้รับทราบ			ที่ของผู้ให้ข่าว กตป.๒๓๗/๐๗/๖๖

๔. ให้คณะทำงานฯ ที่เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สปช.ทร.(๒) ชั้น ๔ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน และผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ RTN Meeting แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบทาง QR Code (แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ) ภายใน ๑๙ ก.ค.๖๖

๕. ให้หน่วยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ RTN Meeting ทดสอบระบบในเวลา ๐๙๐๐ ของวันที่เข้าร่วมประชุมฯ

๖. รายละเอียดประสาน น.ท.ชลวิทย์ ไตรย์พีชน์ หน.ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ กตป.สงป.สปช.ทร. โทร.๕๕๑๔๓ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๑๙๙๑ ๔๑๔๕



QR Code ข้อมูลรายการ
เงินกึ่งงบประมาณปี ๖๕ ฯ



QR Code แบบตอบรับ
การเข้าร่วมประชุมฯ

หน้า ๒ ของ ๒ หน้า	อ้างถึงข่าว..... ชั้นความลับ [] กำหนด [X] ไม่กำหนด	ชื่อผู้เขียนข่าว ตำแหน่ง ผอ.กตป.สงป.สปช.ทร. น.อ. <i>Atway</i> <i>ทอง</i> โทร.๕๕๑๔๓	นายทหารอนุมัติข่าว
		ชื่อผู้รับรองข่าว พล.ร.ท. <i>ดร. เสธ.</i> รอง เสธ.ทร.(สายงานส่งกำลังบำรุง)	



กระดาษเขียนข่าวด่วน

แบบ สส.ท.ร.๘

หน่วย _____	รับจาก _____	วันที่ - เวลา _____
ระบบ _____	ผู้ฝาก _____	ผู้รับ _____
จ่าย _____	ส่งต่อ _____	ระบบ _____
ผู้จ่าย _____	ผู้รับ _____	วันที่ - เวลา _____

ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ	ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ	หมู่วันที่ - เวลา	หมู่คำ
ด่วน	- ปกติ -	๒๗ ๐๙ ๒๕๖๖ ก.ค.๖๖	
จาก สปช.ทร.			ชั้นความลับ
ถึง ผู้รับปฏิบัติ	นชต.ทร. สง.ปรมน.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.		
ผู้รับทราบ	สน.ผบ.ทร. สน.รอง ผบ.ทร. สน.เสธ.ทร. สน.รอง เสธ.ทร.(สายงานส่งกำลังบำรุง)		ที่ของผู้ให้ข่าว กบป. ๕๖/๐๗/๖๖

เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ ๖๖

๑. อ้างถึง ข่าวด่วน สปช.ทร. ด่วนมาก ที่ กบป.๖๖/๐๒/๖๖ มว.๒๓๑๕๐๐ ก.พ.๖๖ เรื่อง มาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม

๒. เนื่องด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ๖๖ เพื่อให้การดำเนินการด้านงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ ๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สปช.ทร.จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ งบประมาณ

๒.๑.๑ ขอให้หน่วยต่าง ๆ ตรวจสอบเงินจัดสรร ประเภทงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และงานที่ ทร. อนุมัติให้ปฏิบัตินอกเหนือจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี ได้แก่ ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ทร. ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้จนถึง ๓๐ ก.ย.๖๖ ทั้งนี้ ให้หน่วยใช้จ่ายงบประมาณให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ ทร.อนุมัติ เป็นหลัก หากหน่วยใดมีงานจำเป็นเร่งด่วนที่อยู่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้ข้างต้น ก่อนดำเนินการจะต้องได้รับการยืนยันจาก สปช.ทร.ว่ามีงบประมาณรองรับแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถดำเนินการได้ และหากหน่วยตรวจสอบแล้วพบว่า มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปัจจุบันไม่เพียงพอให้แจ้ง สปช.ทร.พร้อมชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติ เพื่อพิจารณาด้านงบประมาณตามความเหมาะสม โดยส่งถึง สปช.ทร.ภายใน ๑๕ ส.ค.๖๖

๒.๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค

๑) ให้หน่วยปฏิบัติตามข้อ ๒.๒ ของอ้างถึง ๑ โดยเคร่งครัด

๒) ให้หน่วยที่มีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินสำหรับเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา) พิจารณาดำเนินการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินที่เหลือทั้งหมดเป็นอันดับแรก โดยให้เสนอเรื่องต่อ สปช.ทร. เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ ก.ย.๖๖

๓) หน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าสาธารณูปโภคตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีแล้วแต่ยังคงมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระให้แจ้ง สปช.ทร.ทราบภายใน ๑๕ ส.ค.๖๖ โดยจัดทำรายละเอียดเป็น ๒ หัวงเวลา

หน้า ๑ ของ ๓ หน้า	อ้างถึงข่าว	ชื่อผู้เขียนข่าว ตำแหน่ง ผอ.กบป.สงป.สปช.ทร.	นายทหารอนุมัติข่าว
	ชั้นความลับ	น.อ. โทร. ๕๔๘๒๘	
	[] กำหนด [X] ไม่กำหนด	ชื่อผู้รับรองข่าว	
		พล.ร.ท. ปช.ทร.	



กระดาษเขียนข่าวดำเนินการ

แบบ สส.ทร.๘

หน่วย	รับจาก	วันที่ - เวลา
ระบบ	ผู้ฝาก	ผู้รับ
จ่าย	ส่งต่อ	ระบบ
ผู้จ่าย	ผู้รับ	วันที่ - เวลา

ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ	ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ	หมู่วันที่ - เวลา	หมู่ค่า
ด่วน	- ปกติ -	๒๗ ๐๙ ๒๕ ๖๖	
จาก			ชั้นความลับ
ถึง ผู้รับปฏิบัติ			
ผู้รับทราบ			ชื่อของผู้ให้ข่าว กบป. ๕๒/๐๗/๖๖

ประกอบด้วยช่วงเวลาตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ก.ค.๖๖ และช่วงเวลาตั้งแต่ ๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการงบประมาณ

๒.๑.๓ หน่วยที่มีค่าเบี่ยงเลียงทหารกองประจำการ ให้ประมาณการใช้จ่ายให้เพียงพอ จนถึง ๓๐ ก.ย.๖๖ หากมีเงินจัดสรรคงเหลือให้แจ้งส่งคืน ภายใน ๑๕ ส.ค.๖๖

๒.๒ งบฝึกศึกษา อบรม สัมมนา

๒.๒.๑ รายการใดที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วมีเงินคงเหลือหรือหมดความจำเป็น ให้ส่งคืนงบประมาณโดยขอให้แจ้งรายการพร้อมรหัส BLI ให้ สปช.ทร.ทราบ ภายใน ๑๕ ส.ค.๖๖

๒.๒.๒ รายการใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีแผนการดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่เหลือ ให้หน่วยดำเนินการเบิกเงินงบประมาณแบบ K1 ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ส.ค.๖๖ ส่วนที่เหลือให้ส่งคืนโดยทันที

๒.๒.๓ หากหน่วยไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าหน่วยไม่มีความประสงค์จะเบิกเงินงบประมาณดังกล่าว สปช.ทร.จะดำเนินการรับคืนงบประมาณต่อไป

๒.๓ งบจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยได้รับเงินจัดสรรแล้วให้เร่งรัดก่อนนี้ผู้กัก ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๑ ส.ค.๖๖ กับให้หน่วยถืองบประมาณพิจารณาส่งคืนงบประมาณโดยทันที ในกรณีดังต่อไปนี้



๒.๓.๑ งานที่ดำเนินการแล้ว แต่คาดว่าจะไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ หากดำเนินการต่อไปจะต้องขอเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ ให้หน่วยถืองบประมาณพิจารณาส่งคืนงบประมาณตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

๒.๓.๒ งานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือหมดความจำเป็นแล้ว

๒.๓.๓ เงินเหลือจ่ายจากการก่องหนผู้กัก

๒.๔ งบโครงการผูกพันข้ามปี

๒.๔.๑ โครงการผูกพันข้ามปีที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี ๖๕ จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ ๖๖ (๒๕ ก.ย.๖๖) ให้หน่วยถืองบประมาณเร่งรัดการชำระหนี้ตามวงงานที่เหลือ โดยใช้เงินขยายปี ๖๕ ให้ได้ทั้งหมดหรือมากที่สุด เนื่องจากหากมีเงินคงเหลือจะต้องถูกพับไป

หน้า ๒ ของ ๓ หน้า	อ้างถึงข่าว	ชื่อผู้เขียนข่าว ตำแหน่ง ผอ.กบป.สงป.สปช.ทร.	นายทหารอนุมัติข่าว
	ชั้นความลับ	น.อ.  โทร. ๕๔๘๒๘๘	
	<input type="checkbox"/> กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด	ชื่อผู้รับรองข่าว	
		พล.ร.ท.  ปช.ทร.	



กระดาษเขียนข่าวราชนาวิ

แบบ สส.ทร.๘

หน่วย _____	รับจาก _____	วันที่ - เวลา _____
ระบบ _____	ผู้ฝาก _____	ผู้รับ _____
จ่าย _____	ส่งต่อ _____	ระบบ _____
ผู้จ่าย _____	ผู้รับ _____	วันที่ - เวลา _____

ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ ด่วน	ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ - ปกติ -	หมู่วันที่ - เวลา ๒๗๐๕๒๒ ก.ค.๖๖	หมู่คำ
จาก _____			ชั้นความลับ
ถึง ผู้รับปฏิบัติ _____			
ผู้รับทราบ			ชื่อของผู้ให้ข่าว กบป. ๕๒/๐๗/๖๖

๒.๔.๒ โครงการผูกพันข้ามปีที่ใช้จ่ายจากงบประมาณปี ๖๖ ให้หน่วยถึงงบประมาณเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงงานที่วางแผนไว้ และแจ้งยอดวงเงินคงเหลือที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ๓๐ ก.ย.๖๖ ให้ สปช.ทร. เพื่อขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ทั้งนี้ หากมีรายการใดที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันขอให้เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๖



๒.๔.๓ โครงการผูกพันข้ามปีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันให้หน่วยถึงงบประมาณเร่งรัดการดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน โดยลงนามในสัญญาภายใน ๓๐ ก.ย.๖๖ และตรวจสอบรายการที่ต้องขอความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ และรายการที่ต้องขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจาก ร.มว.กท.ก่อนการลงนามในสัญญา โดยประสานโดยตรงกับ สปช.ทร.ต่อไป

๒.๔.๔ โครงการผูกพันข้ามปีที่ดำเนินการและตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่าย และหากมีเงินเหลือจ่ายให้แจ้ง สปช.ทร.ส่งคืนงบประมาณโดยเร็ว

๒.๕ **งบบัญชีการ** ให้หน่วยเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับเงินจัดสรรให้แล้วเสร็จก่อน ๑๕ ก.ย.๖๖ หากประมาณการตามที่ต้องจ่ายจริงแล้วมีวงเงินคงเหลือไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใน ๒๕ ส.ค.๖๖

๓. รายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมประสาน ดังนี้

- ๓.๑ งบประมาณ : ร.อ.หญิง จิราภรณ์ เลขนะมงคล โทร ๕๓๐๗๑
- ๓.๒ งบฝึกศึกษา อบรม สัมมนาฯ : น.ท.หญิง จิตรทิพย์ หว่านพีชน์ โทร ๕๓๐๗๑
- ๓.๓ งบปฏิบัติการ : น.ท.ฤทธิรงค์ อยู่เจริญ โทร ๕๘๕๕๔
- ๓.๔ งบจัดซื้อจัดจ้าง : น.ท.ชนชวิน วรกุลธนโชติ โทร ๕๘๕๕๖
- ๓.๕ งบโครงการผูกพันข้ามปี : น.ท.พิพัฒน์ ภคณิข โทร ๕๔๐๒๔
- ๓.๖ เงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน : ว่าที่ น.ต.ธาวี นิลพิบูลย์ โทร ๕๘๕๕๕

หน้า ๓ ของ ๓ หน้า	อ้างถึงข่าว _____	ชื่อผู้เขียนข่าว ตำแหน่ง ผอ.กบป.สพ.สปช.ทร.	นายทหารอนุมัติข่าว
	ชั้นความลับ	น.อ.  โทร. ๕๔๘๒๘	
	<input type="checkbox"/> กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด	ชื่อผู้รับรองข่าว	
		พล.ร.ท.  ปช.ทร.	

๒๐๐. ๖๖๖๖๖๖

กระดาษเขียนข่าวราชนาวิ

แบบ สส.ทร.๘

หน่วย	ศก.๓	รับจาก	สปช.ทร.	วันที่ - เวลา	๒๕๖๖
ระบบ	ทพ.๘.	ผู้ฝาก	ทพ.๓ พว.๗กร.	ผู้รับ	ท.จ.๐.๖๖๖.
จ่าย		ส่งต่อ		ระบบ	
ผู้จ่าย		ผู้รับ		วันที่ - เวลา	

ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ	ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ	หมุนวนที่ - เวลา	มูลค่า
ด่วนมาก	- ปกติ -	๒๕๖๕๐๐ ก.พ.๖๖	
จาก สปช.ทร.			ชั้นความลับ
ถึง ผู้รับปฏิบัติ	นชต.ทร. สง.ปรมน.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.		
ผู้รับทราบ	สน.ผบ.ทร. สน.รอง ผบ.ทร. สน.เสธ.ทร. สน.รอง เสธ.ทร. ๕ ฝ่าย		ที่ของผู้ให้ข่าว
			กบ. ๖๖ /๐๖/๖๖



เรื่อง มาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม

๑. อ้างถึง ผนวก ข ท้ายบันทึก สปช.ทร. ลับ ที่ กทท ๐๕๐๙.๗/๒๖๘ ลง ๒๑ ก.ค.๖๕ เรื่อง มาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. เนื่องจากความต้องการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าสาธารณูปโภคของหน่วยต่าง ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกินกว่ากรอบวงเงินที่ ทร. อนุมัติไว้ตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วย ซึ่งที่ผ่านมา สปช.ทร. ได้จัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนมาก สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการ บริหารจัดการตามข้างต้น ดังนั้น เพื่อลดภาระงบประมาณในเรื่องดังกล่าว สปช.ทร. จึงขอแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณด้านการ บริหารจัดการ เพิ่มเติมจากที่อนุมัติไว้ตามอ้างถึง ๑ ให้หน่วยนำไปปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๒.๑.๑ ให้หน่วยบริหารงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณ ในห้วงเวลาที่เหลือ (ตั้งแต่ มี.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖) ด้วยความประหยัดอย่างเคร่งครัด ภายในกรอบวงเงินที่หน่วยได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๖๖ กรณีที่ ่วยมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากแผนฯ และได้เสนอ สปช.ทร.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว สปช.ทร. จะดำเนินการด้านงบประมาณ โดยพิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วนของงานเพิ่มเติมดังกล่าว และพิจารณาจากสถิติการเบิกจ่าย งบประมาณของหน่วยในปีงบประมาณที่ผ่านมาและสถานภาพด้านงบประมาณของ ทร. ในขณะนั้น สำหรับการพิจารณาให้กำลังพล ของหน่วยปฏิบัติงานหรือลงคำสั่งไปปฏิบัติราชการทุกครั้ง ขอให้หน่วยพิจารณาวงเงินงบประมาณที่เหลือของหน่วยให้สามารถ รองรับได้ หรือได้รับเอกสารยืนยันจาก สปช.ทร. สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณได้ จึงสามารถเบิกยืมเงินได้ ทั้งนี้ หากหน่วย ดำเนินการโดยไม่มีกรรองรับดังกล่าว และสถานภาพด้านงบประมาณในภาพรวมของ ทร. ไม่เอื้ออำนวยที่จะสนับสนุนให้ได้ หน่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ได้เบี่ยงมิมา

หน้า ๑ ของ ๒ หน้า	อ้างถึงข่าว	ชื่อผู้เขียนข่าว ตำแหน่ง ผอ.กบ.ปลง.สปช.ทร.	นายทหารอนุมัติข่าว
	ชั้นความลับ	น.อ.  โทร. ๕๔๘๒๘	
	<input type="checkbox"/> กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด	ชื่อผู้รับรองข่าว	
		พล.ร.ท.  ปช.ทร.	
